


# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P24-CO-V\_2023.09.07

Microcantiere: H3 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Liceo Statale A. Cornaro  
Via Antonio Riccoboni

Data misura: 07/09/2023 Durata: 3597.6 sec Temperatura: 27°C  
Ora inizio: 14:39:32 Precipitazioni: / Umidità: 78%  
Ora fine: 15:39:29 Vento: inf. 5 m/s

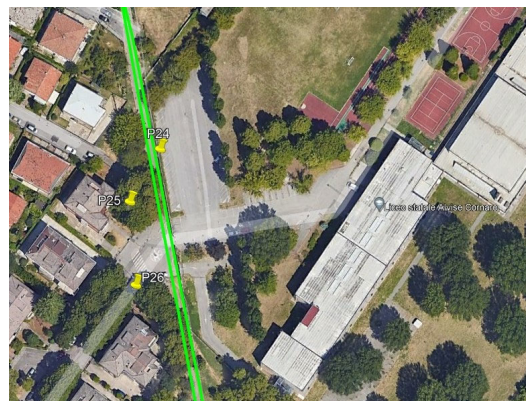

## Attività di cantiere:



scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat,  
posa cavidotti e scarifica terreno

## Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

## Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

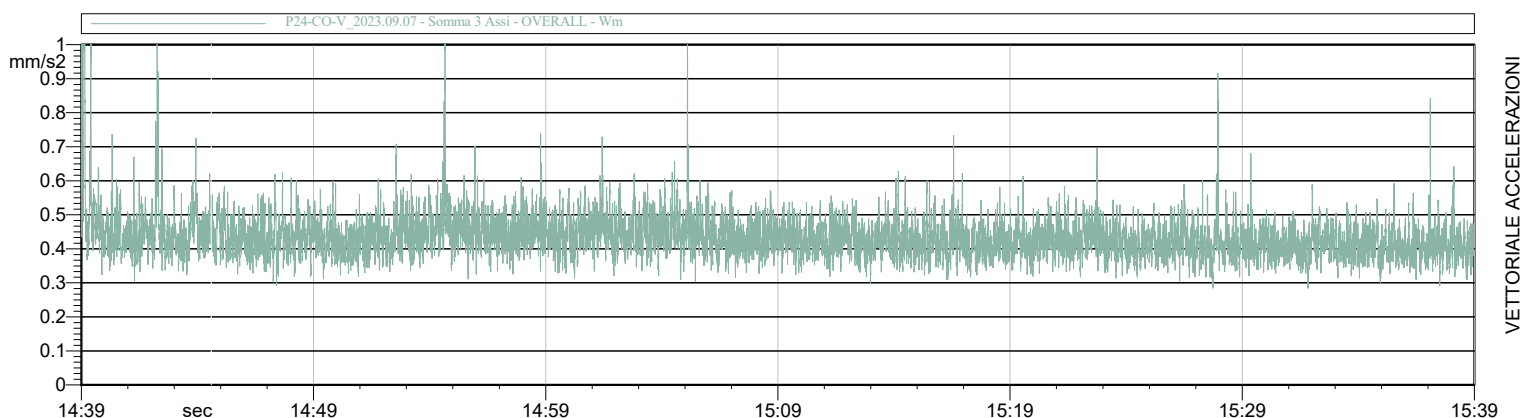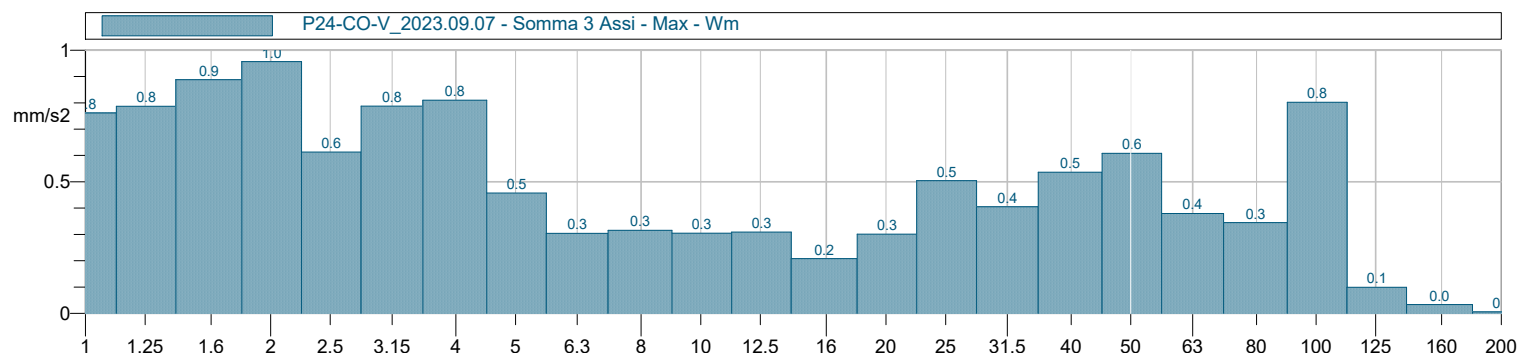

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

0.3 mm/s²

VALORE MISURATO  
aw,95

0.4 mm/s²

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
