

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P12-CO-V_2026.04.01

Microcantiere: F3 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Fermata OSPEDALE

Data misura: 01/04/2026 Durata: 3015.6 sec Temperatura: 13°C

Ora inizio: 14:18:02 Precipitazioni: / Umidità: 67%

Ora fine: 15:08:17 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:




formazione di platee e altre opere in cls gettato in opera

Eventi generati dal cantiere:

uso di autobetoniere per versamento cls, i picchi sono perlopiù correlati a tali mezzi, lavorazioni di stesura del cls solo manuali

Eventi non generati dal cantiere:

vibrazioni da traffico cittadino e delle relative attività antropiche

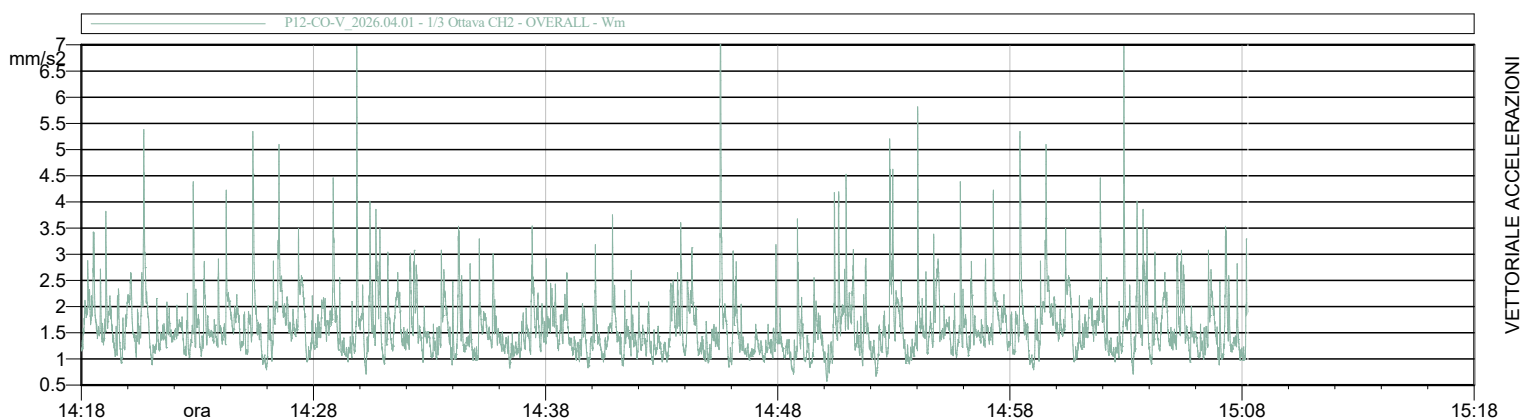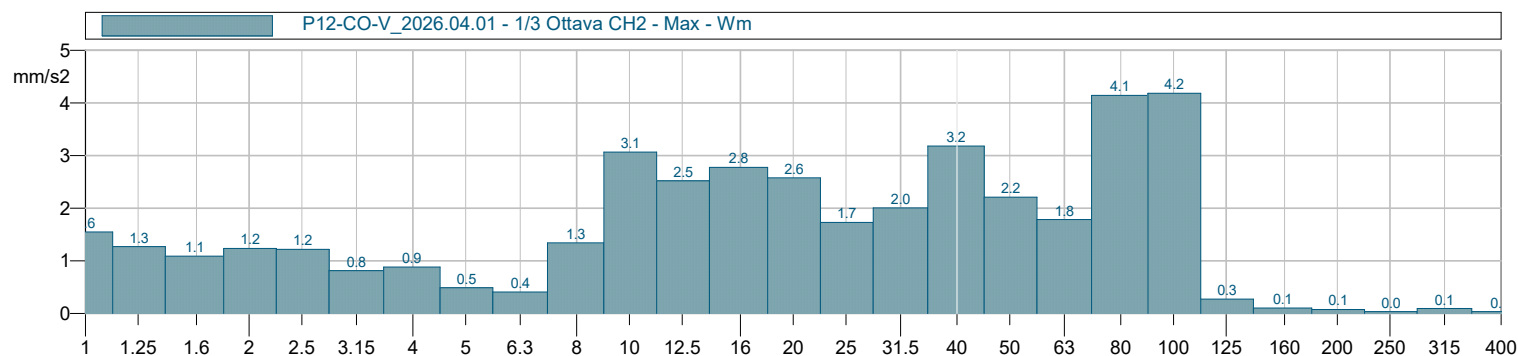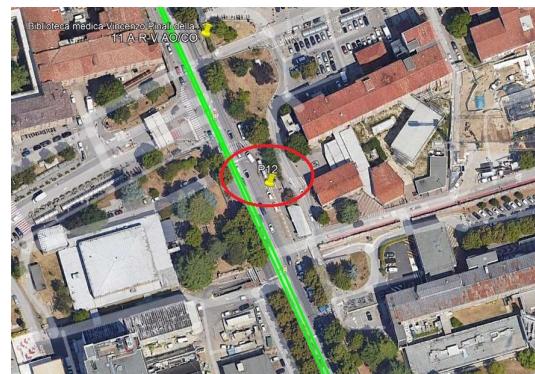

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.6 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

7.0 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
i picchi sono
dovuti alla presenza
delle autobetoniere,
che generano
vibrazioni
sul terreno
