

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P41BIS\_CO\_V\_2026.03.03

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione: **Deposito Voltabarozzo (sottostazione elettrica)**

Data misura: 03/03/2026 Durata: 19238.3 sec Temperatura: 12°C

Ora inizio: 09:29:11 Precipitazioni: / Umidità: 68%

Ora fine: 14:49:49 Vento: inf. 5 m/s



Attività di cantiere:



**vibroinfissione dei palancolati a margine della sottostazione elettrica del capolinea di Voltabarozzo**

Eventi generati dal cantiere:

**lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere:

**valori di fondo dovuti oerlopiù al traffico sulla tangenziale**

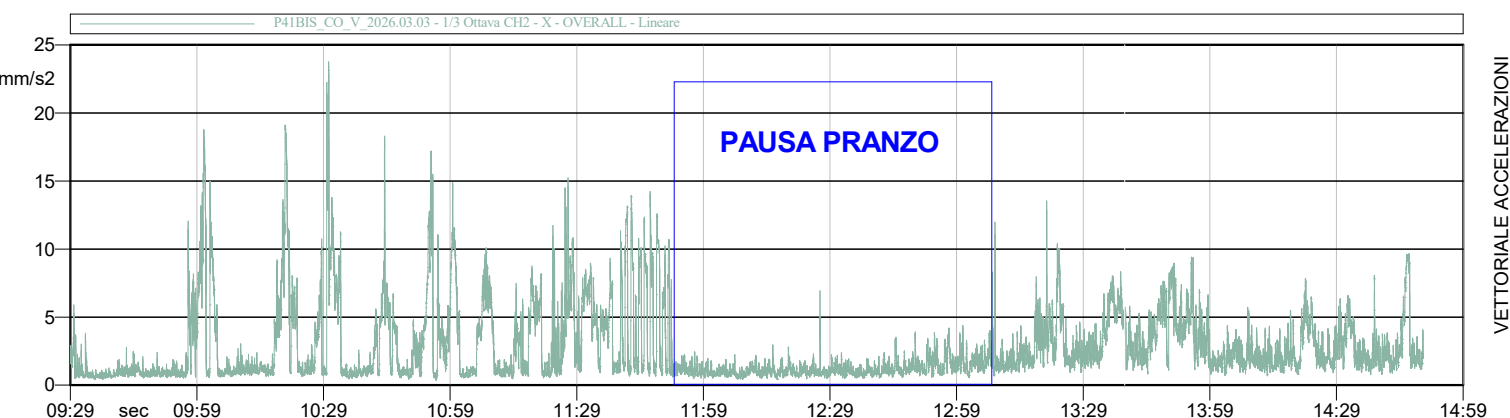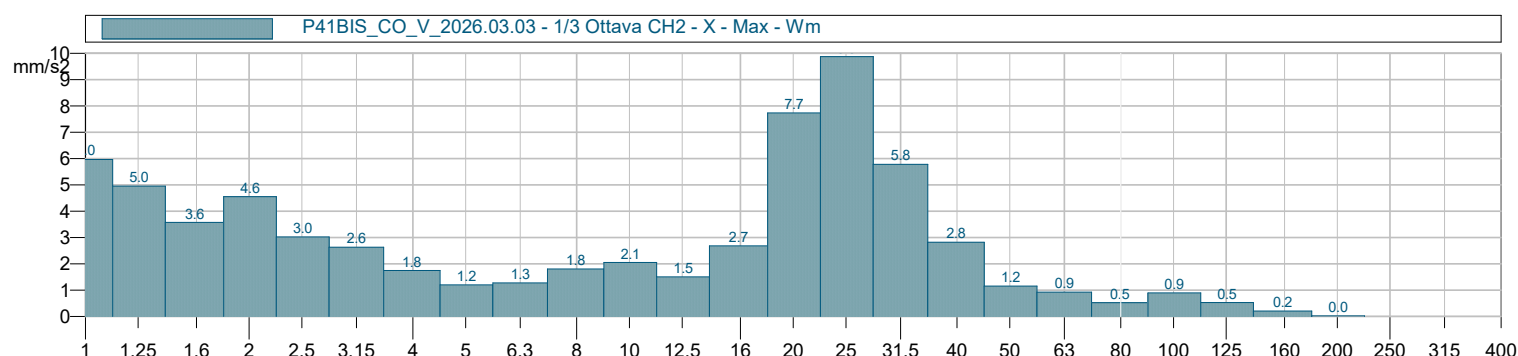

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

**0.4 mm/s²**

VALORE MISURATO  
**aw,95**

**23.8 mm/s²**

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

**7,2 mm/s²**

**NOTE**

chiaramente percepibili le  
attività di vibroinfissione,  
livelli misurati coerenti con  
il tipo di attività ma non  
particolarmente elevati  
Visibile pausa pranzo  
senza vibroinfissioni
