

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

**Cod. Misura: P25-CO-V\_2023.10.03**

**Microcantiere: H3 Fase: CORSO D'OPERA**

**Posizione marciapiede a lato di Via Antonio Riccoboni  
nei pressi della scuola**

**Data misura: 03/10/2023 Durata: 1624.5 sec Temperatura: 24°C**  
**Ora inizio: 10:55:59 Precipitazioni: / Umidità: 65%**  
**Ora fine: 11:23:03 Vento: inf. 5 m/s**

**Attività di cantiere:**



**opere di asfaltatura di un tratto di giunzione del cantiere**

**Eventi generati dal cantiere:**

**vibrofinitrice, autocarro con conglomerato e rullo compattatore**

**Eventi non generati dal cantiere:**

**valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

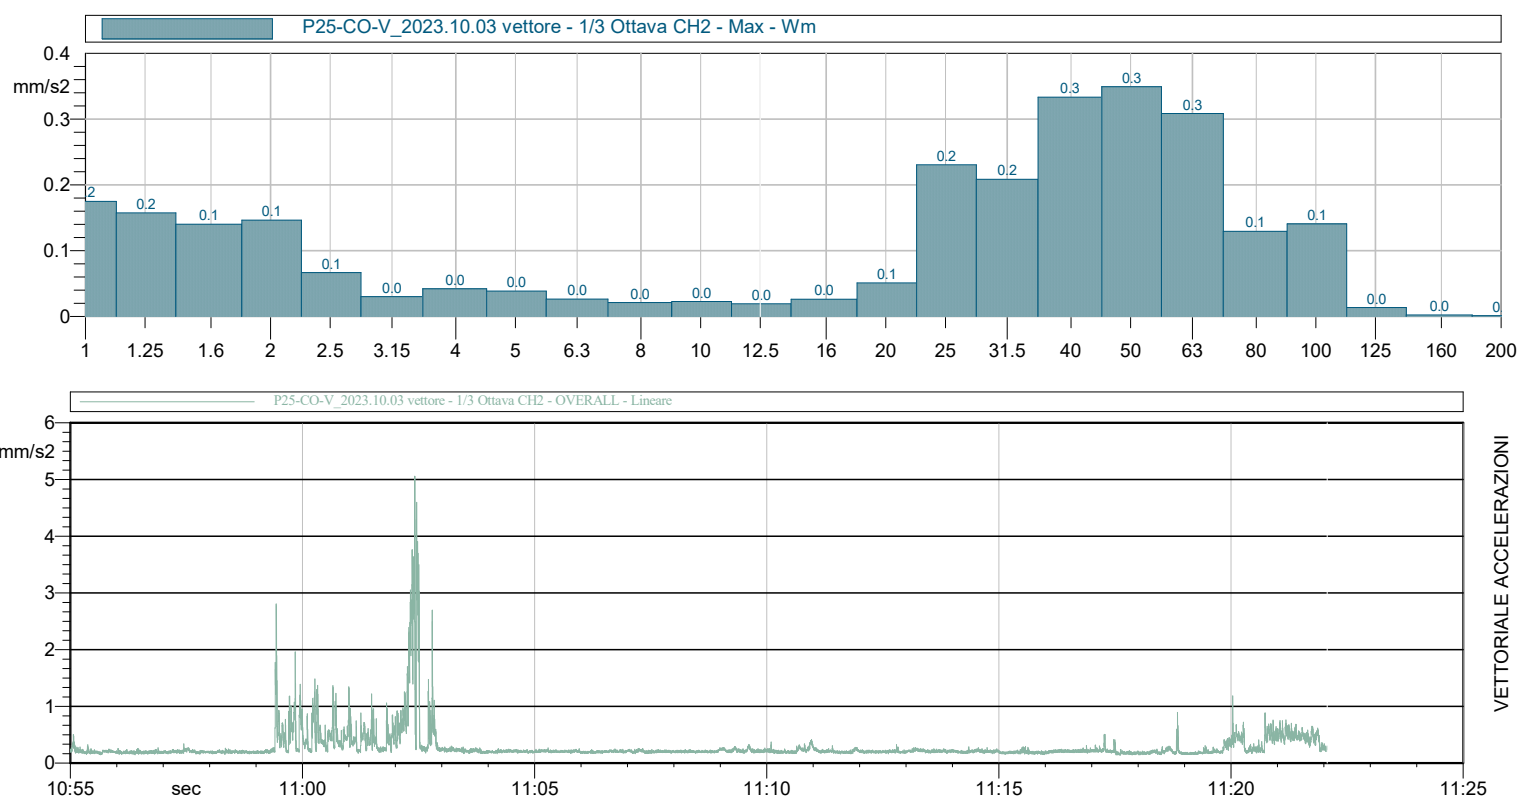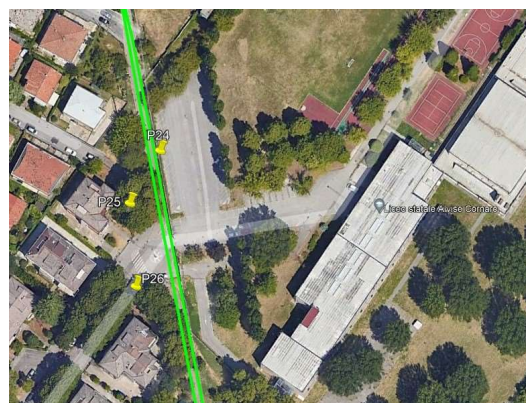

**LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)**

**0.1 mm/s²**

**VALORE MISURATO  
aw,95**

**0.4 mm/s²**

**LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo**

**7,2 mm/s²**

**NOTE**
