

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P5-CO-V_2024.09.26

Microcantiere: B1 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Via Gozzi

Data misura: 26/09/2024 Durata: 3600.0 sec Temperatura: 23°C

Ora inizio: 11:30:10 Precipitazioni: / Umidità: 63%

Ora fine: 12:30:10 Vento: inf. 5 m/s



Attività di cantiere:



scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat,
posa cavidotti e scarifica terreno

Eventi generati dal cantiere:

posa ferro armatura piattaforma, attrezzatura manuale

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

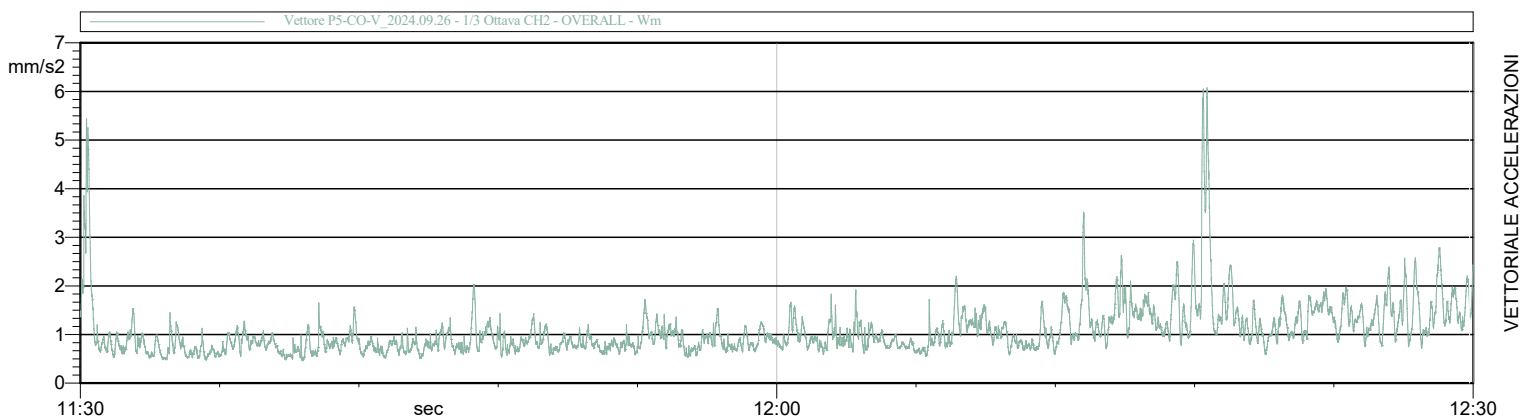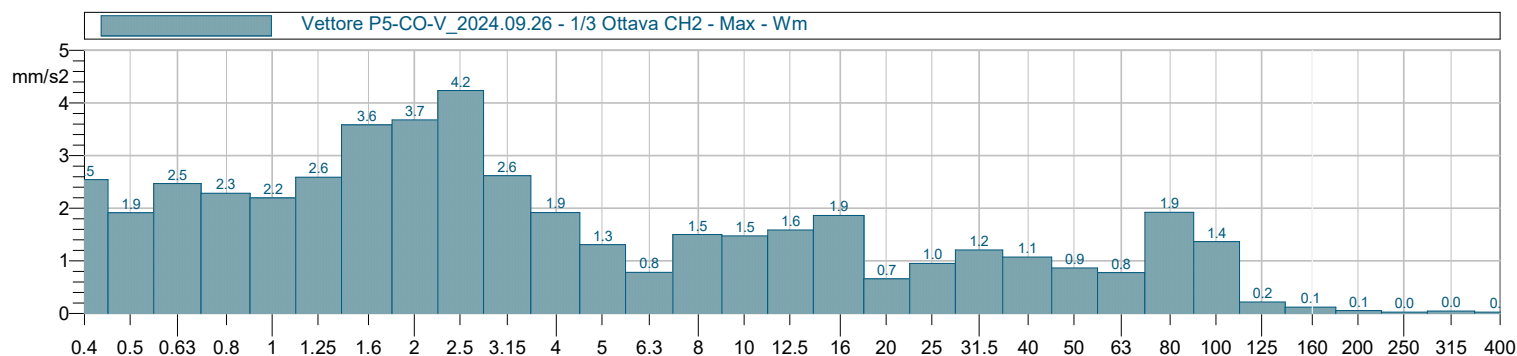

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.9 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

1.2 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE

Misura eseguita
all'interno
dell'area di cantiere
