

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P40-CO-V_2024.05.07

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Deposito Voltabarozzo**

Data misura: 07/05/2024 Durata: 4487.6 sec Temperatura: 16°C

Ora inizio: 14:14:30 Precipitazioni: / Umidità: 83%

Ora fine: 15:29:17 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:




**scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat,
posa cavidotti e scarifica terreno**

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

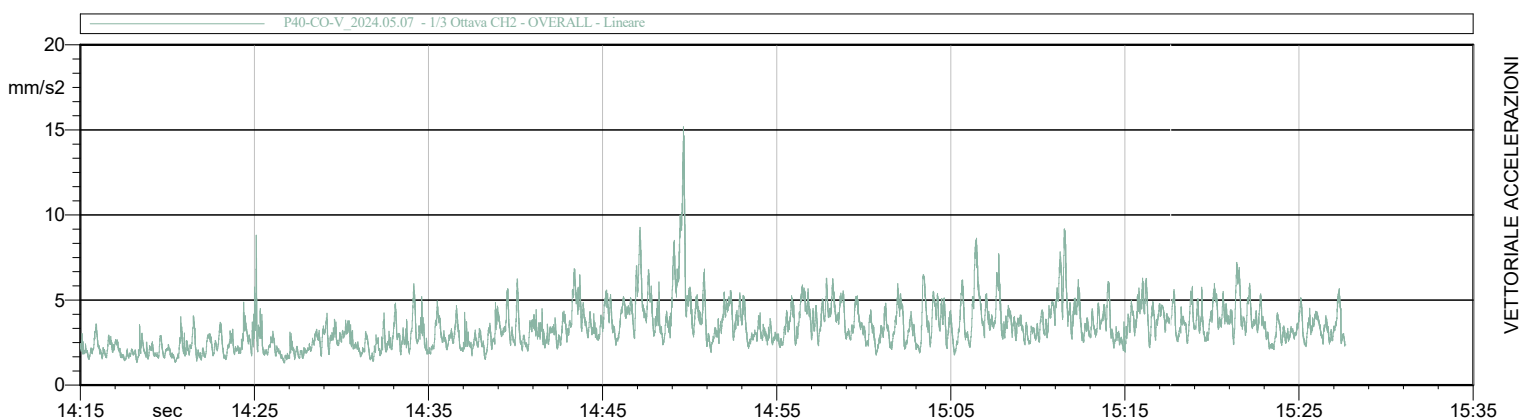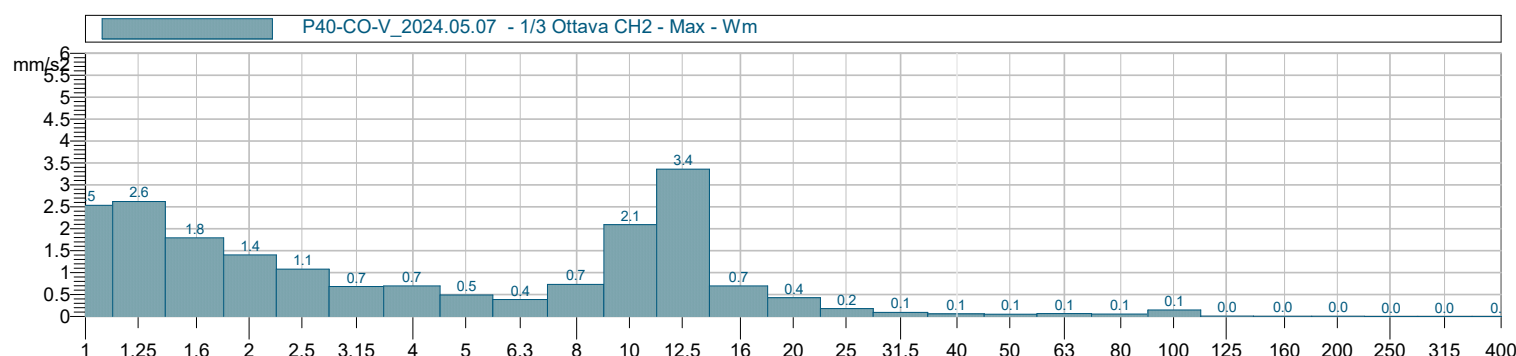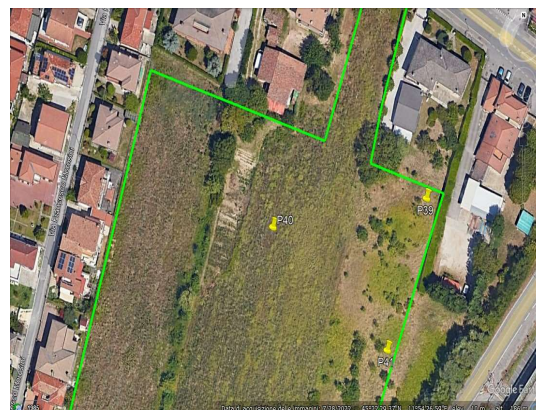

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.3 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

3.6 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
