

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P14-CO-V\_2024.11.19

Microcantiere: H-1 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione **Cantiere della  
fermata Forcellini**

Data misura: 19/11/2024 Durata: 3600.0 sec Temperatura: 9°C  
Ora inizio: 10:19:10 Precipitazioni: / Umidità: 78%  
Ora fine: 11:19:10 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



**costruzione della pensilina della fermata ed altre opere accessorie**

Eventi generati dal cantiere:

**lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere:

**valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

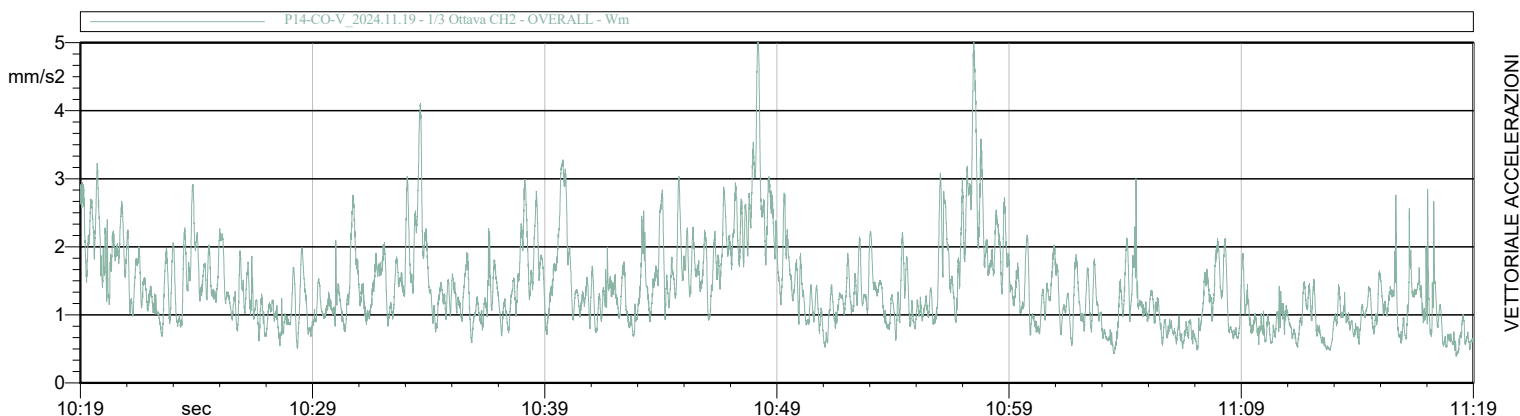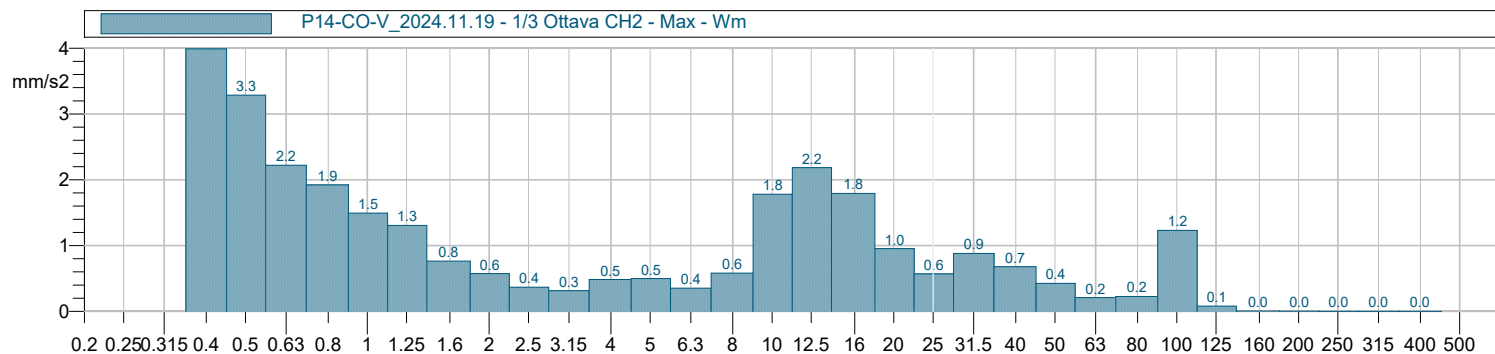

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

**0.4 mm/s²**

VALORE MISURATO  
**aw,95**

**5.1 mm/s²**

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

**7,2 mm/s²**

NOTE
