

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P21-CO-V-2024.10.08**

Microcantiere: **H1** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Via G. Canestrini /Parco IRIS**

Data misura: **08/10/2024** Durata: **3600.0 sec** Temperatura: **16°C**

Ora inizio: **09:59:55** Precipitazioni: **/** Umidità: **89%**

Ora fine: **10:59:55** Vento: **inf. 5 m/s**

Attività di cantiere:



**costruzione del piano rotabile, delle infrastrutture e dei sistemi di comunicazione**

Eventi generati dal cantiere:

**lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere:

**valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

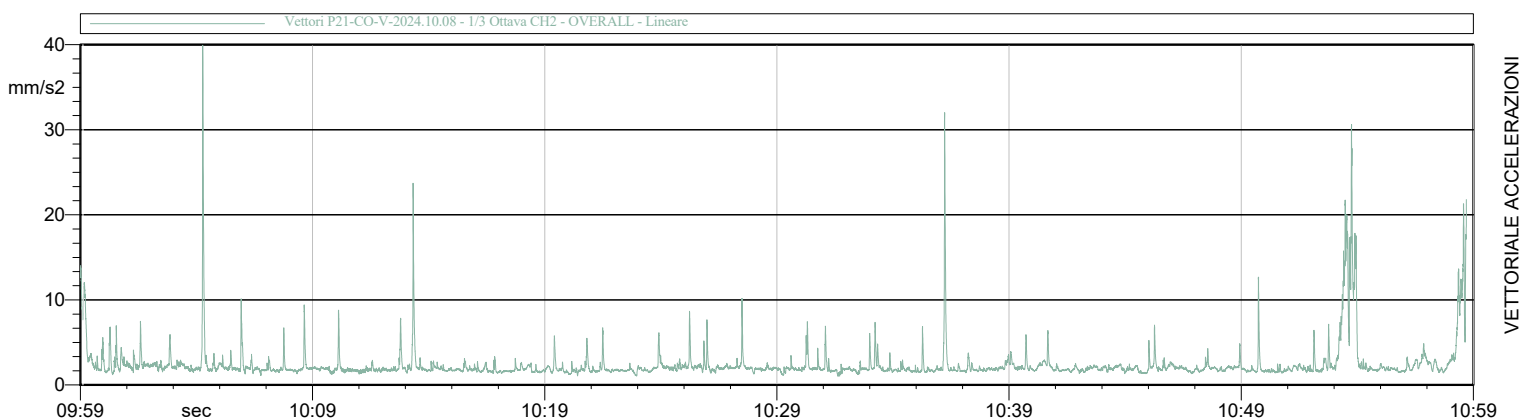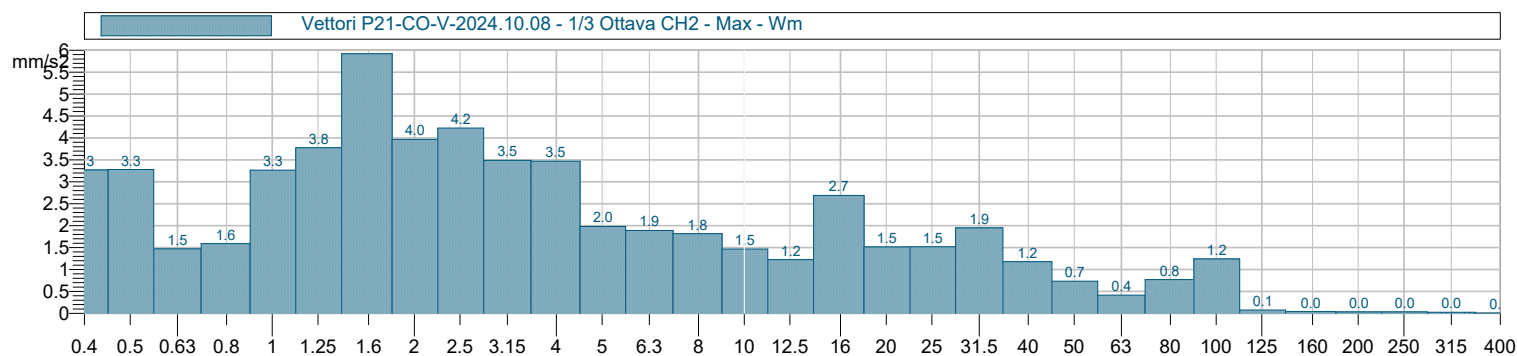

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

**1.0 mm/s²**

VALORE MISURATO  
**aw,95**

**3.2 mm/s²**

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

**7,2 mm/s²**

NOTE
