

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P34-CO-V\_2025.04.09

Microcantiere: L-2 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Fermata NANI - quartiere Voltabarozzo

Data misura: 09/04/2025 Durata: 3373.2 sec Temperatura: 12°C

Ora inizio: 10:21:02 Precipitazioni: / Umidità: 70%

Ora fine: 11:17:15 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



**finitura delle piste di transito e della strada circostante, posa cordoli ed altre finiture**

Eventi generati dal cantiere:

movimentazione di materiale metallico, barre e strutture prefabbricate

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

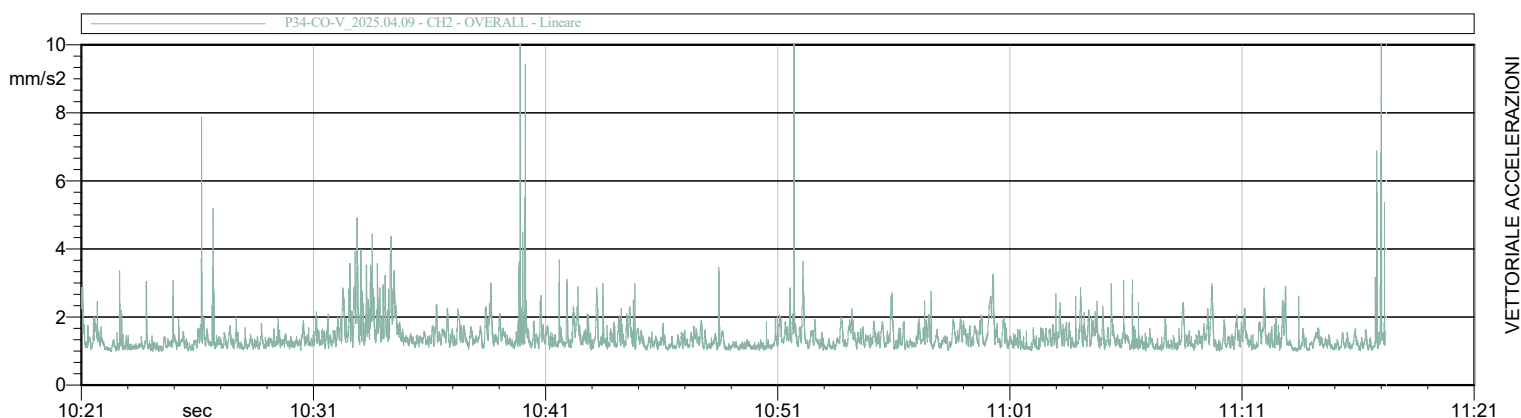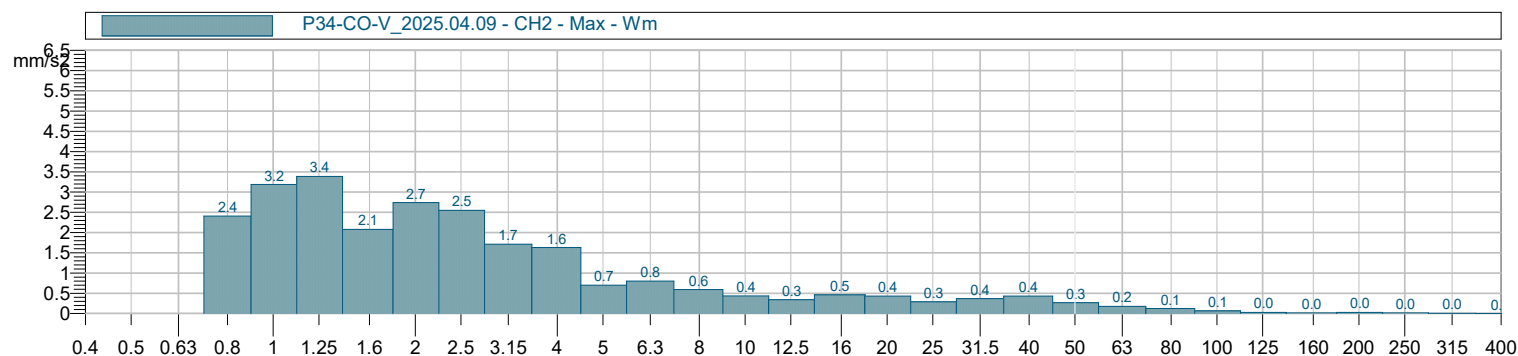

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

**1.0 mm/s²**

VALORE MISURATO  
aw,95

**1.4 mm/s²**

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

**7,2 mm/s²**

NOTE
