

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P34-CO-V_2025.06.18

Microcantiere: L-2 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Fermata NANI - quartiere Voltabarozzo

Data misura: 18/06/2025 Durata: 3915.2 sec Temperatura: 26°C

Ora inizio: 11:04:00 Precipitazioni: / Umidità: 62%

Ora fine: 12:09:15 Vento: inf. 5 m/s



Attività di cantiere:



finitura delle piste di transito e delle opere accessorie

Eventi generati dal cantiere:

movim. di materiale in genere, strutture prefabbricate ed altre componenti

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

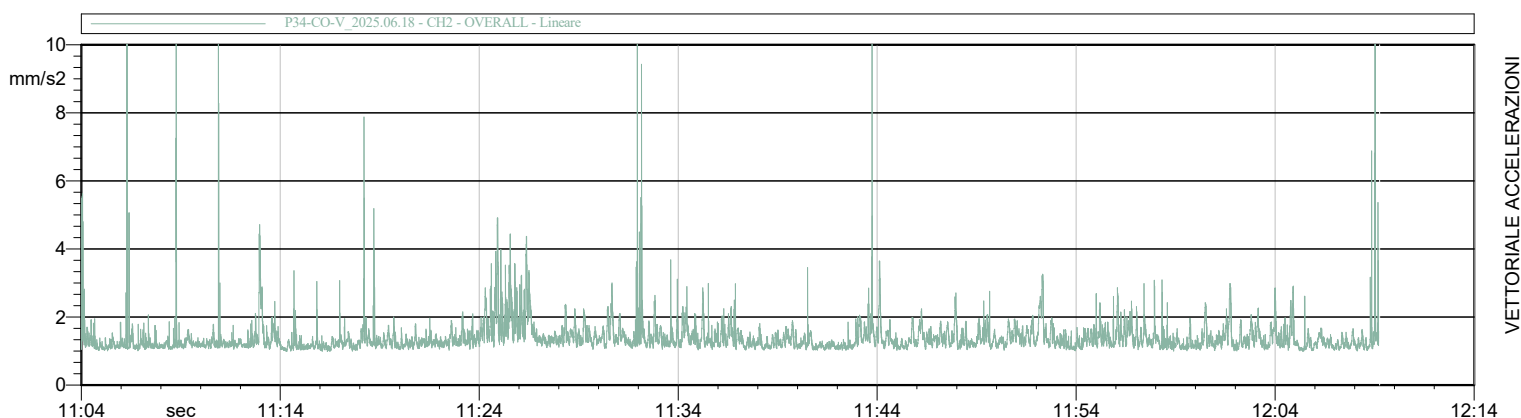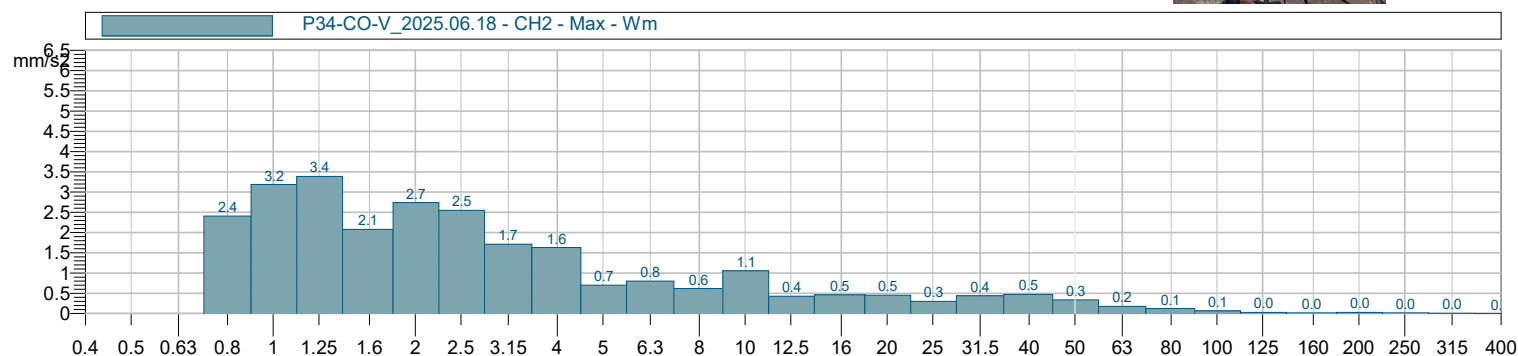

VETTORIALE ACCELERAZIONI

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.0 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

1.4 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
