

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P02-CO-V_2026.05.27

Microcantiere: A1 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Rotatoria tra Via della Pace e P.le Stazione

Data misura: 27/05/2026 Durata: 3600.0 sec Temperatura: 27°C

Ora inizio: 09:17:45 Precipitazioni: / Umidità: 68%

Ora fine: 10:17:45 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:




posa di polifore, corrugati e pozzetti di ispezione per i cavi elettrici

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni prettamente manuali e piccoli lavori con attrezzi a batteria

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

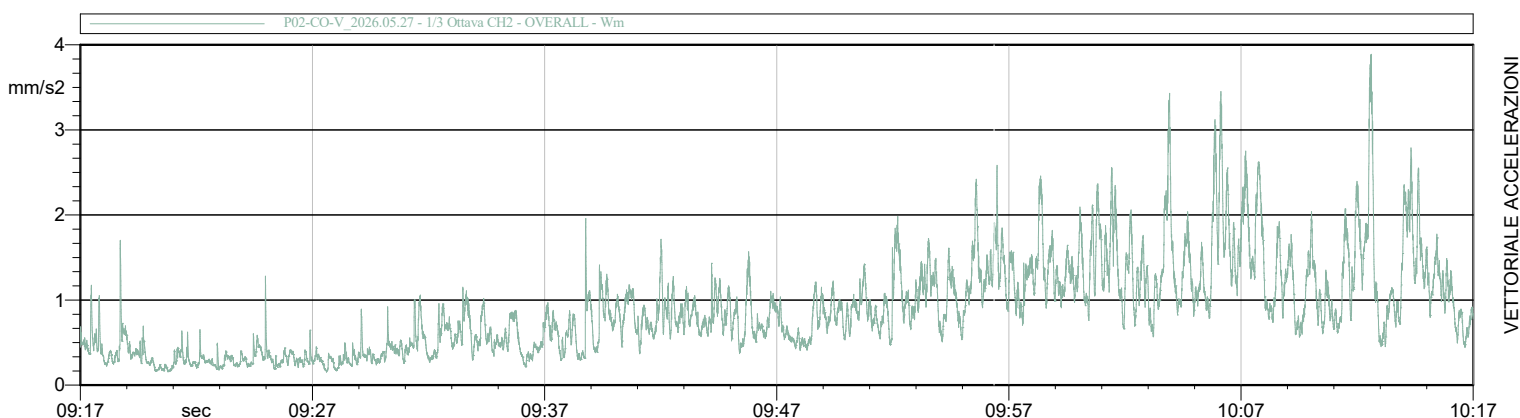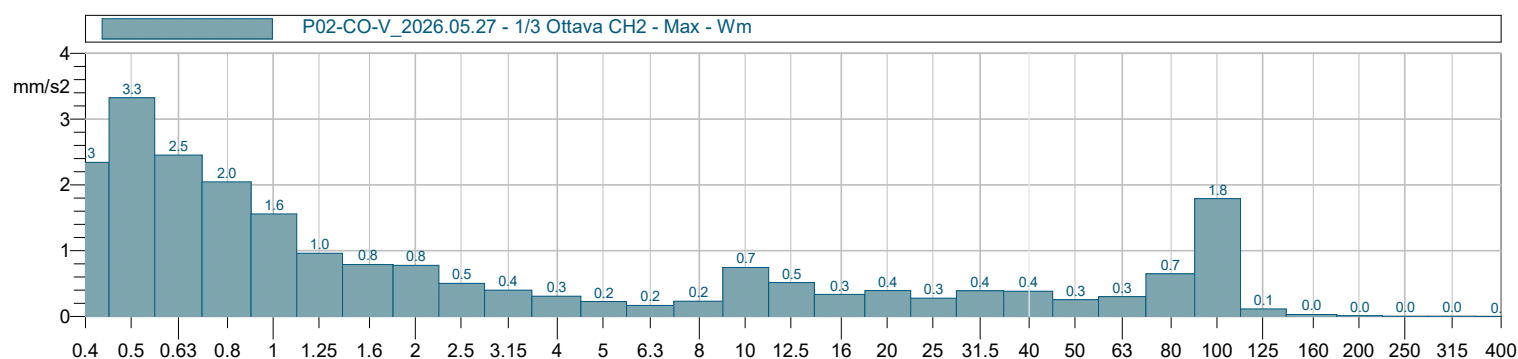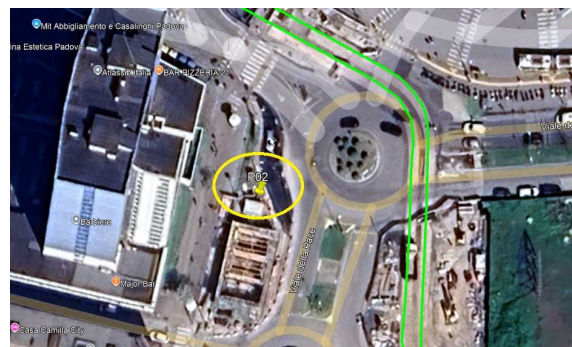

**LIVELLO DI FONDO
(Bianco)**

0.2 mm/s²

**VALORE MISURATO
aw,95**

1.0 mm/s²

**LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo**

7,2 mm/s²

NOTE
