

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P12-CO-R_2026.01.20

Microcantiere: F3 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Fermata OSPEDALE

Data misura: 20/01/2026 Durata: 3540.3 sec Temperatura: 8°C
Ora inizio: 08:45:43 Precipitazioni: / Umidità: 82%
Ora fine: 09:44:43 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:




opere di finitura, posa cavi ed altri interventi a basso impatto

Eventi generati dal cantiere:

nessuna lavorazione generante vibrazioni percepibili.

Eventi non generati dal cantiere:

vibrazioni da traffico cittadino e delle relative attività antropiche

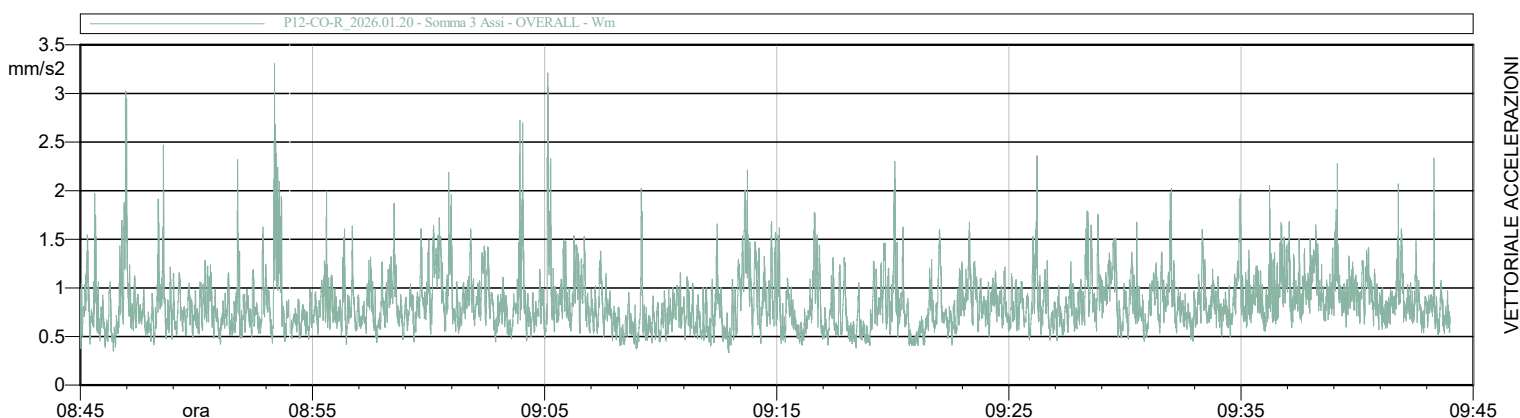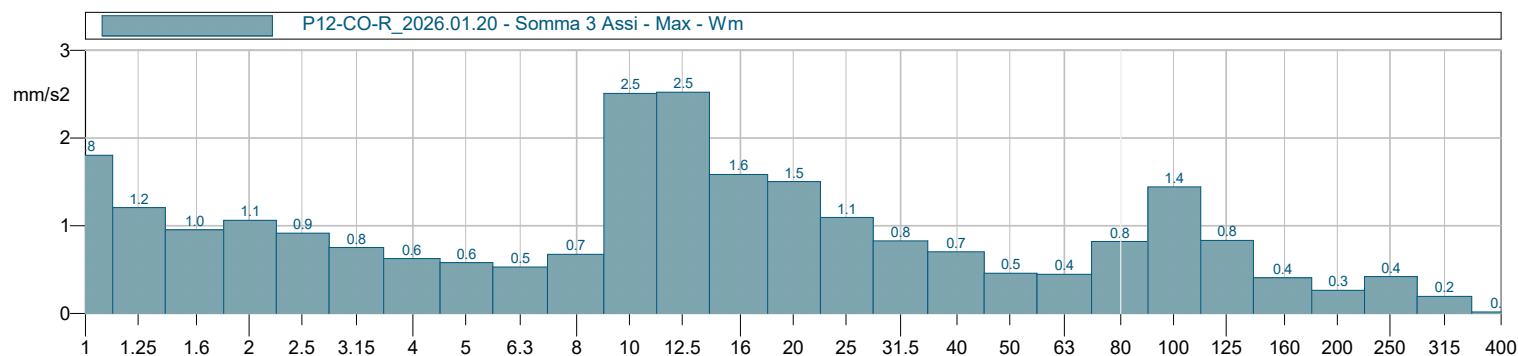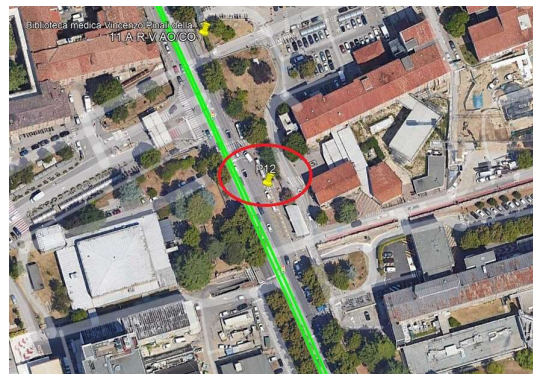

**LIVELLO DI FONDO
(Bianco)**

0.3 mm/s²

**VALORE MISURATO
aw,95**

3.0 mm/s²

**LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo**

7,2 mm/s²

NOTE
