

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P39_CO_V_2026.03.19

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Capolinea deposito Voltabarozzo**

Data misura: 19/03/2026 Durata: 5496.5 sec

Ora inizio: 14:09:02 Precipitazioni: / Temperatura: 12°C

Ora fine: 15:40:38 Vento: inf. 5 m/s Umidità: 52%

Attività di cantiere:



costruzione delle strutture del deposito convogli tranviari, strutture metalliche ed attività di finitura

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni soprattutto con PLE ed attrezzature analoghe

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico e della officina meccanica confinante

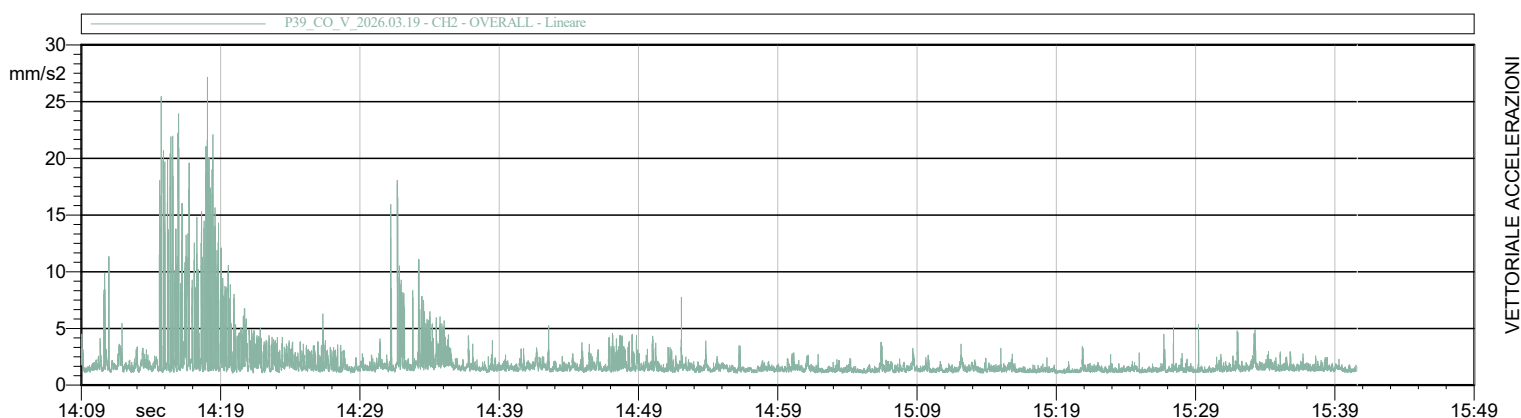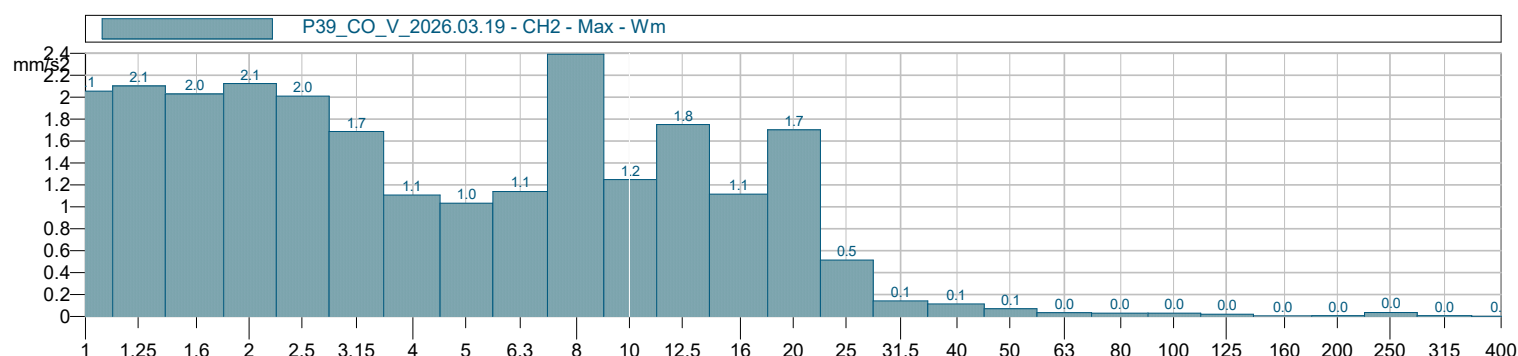

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.0 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

18.1 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE

I maggiori eventi
sono dovuti a
transito di mezzi
e PLE in prossimità
del punto misura
