

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P41_CO_V_2026.03.17


Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Deposito Voltabarozzo**

Data misura: 17/03/2026 Durata: 3551.9 sec Temperatura: 12°C

Ora inizio: 10:00:11 Precipitazioni: / Umidità: 68%

Ora fine: 10:59:22 Vento: inf. 5 m/s

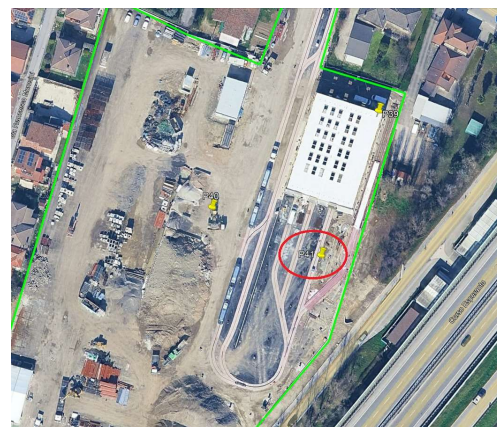

Attività di cantiere:



fasi di finitura del deposito dei convogli tranviari, piazzali e binari di manovra

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo dovuti oerlopiù al traffico sulla tangenziale

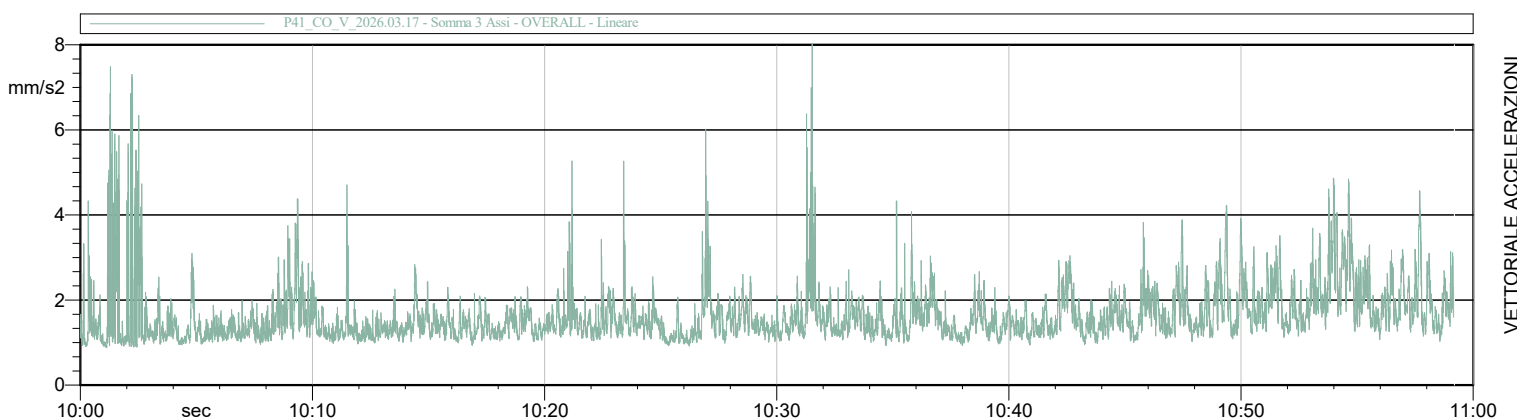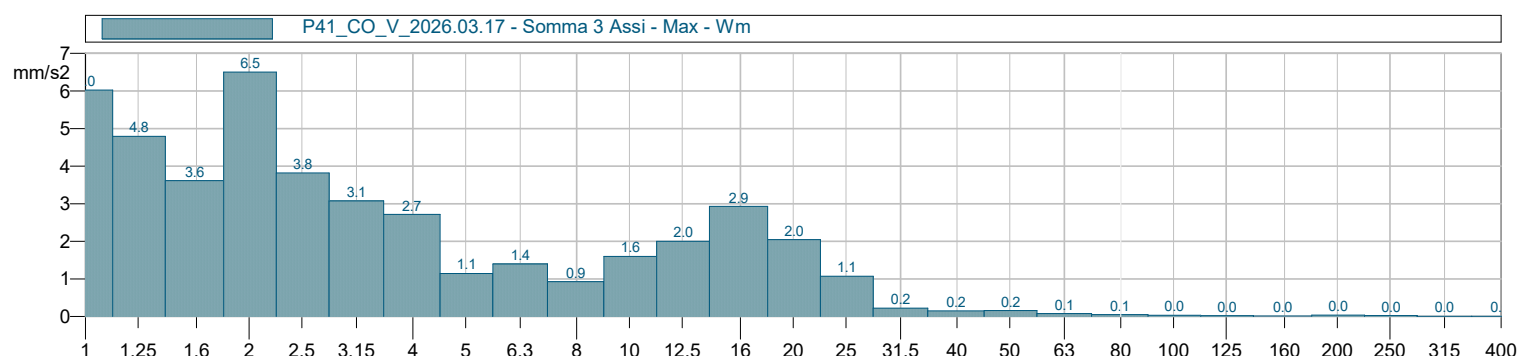

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.9 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

1.7 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
