

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

COD.MISURA P29 R 19.01.2024

Posizione **Ponte Voltabarozzo**

Data mis.: 19/01/2024

Ora inizio: 09:32:56

Ora fine: 09:46:51

Durata: 835.1 sec

Microcantiere: **I3**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 7.3°C

Precipitazioni: /

Umidità: 99%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 56.0 dBA

Max = 69.7 dB

L50 = 53.6 dB

Min = 45.3 dB



L10 = 59.3 dB

L95 = 48.7 dB

Attività di cantiere: **scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat, posa cavidotti e scarifica terreno**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

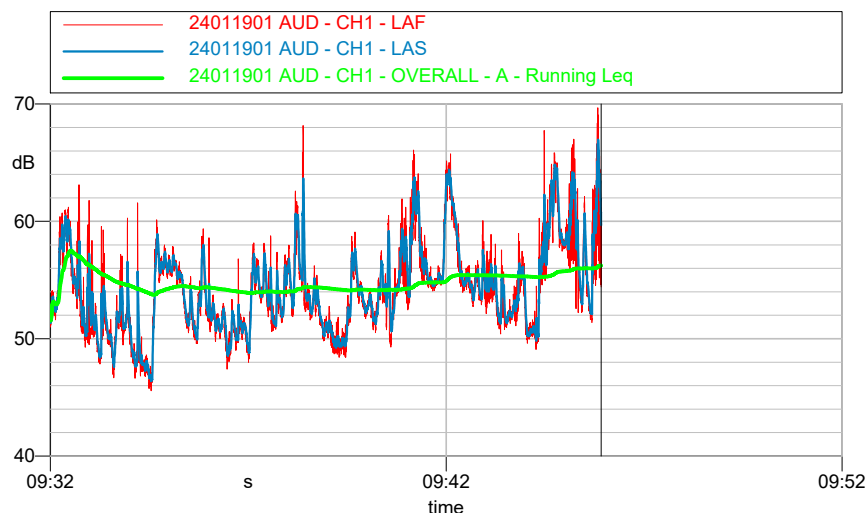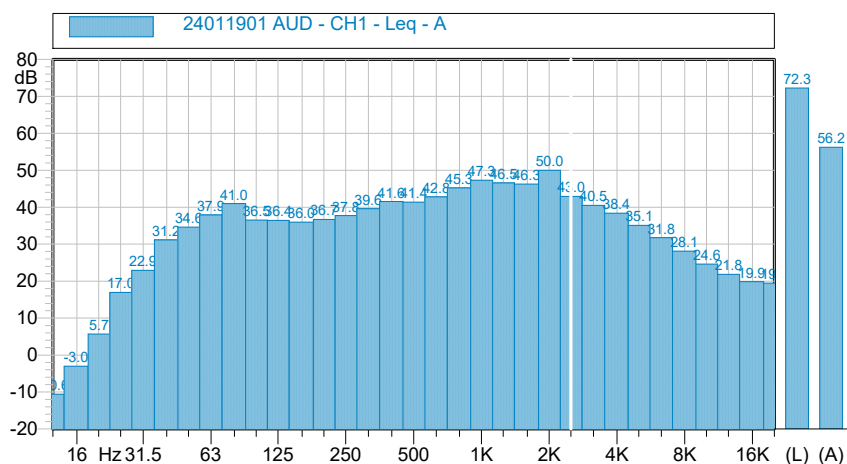

VALORE ANTE OPERA

L_{Aeq}
70 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

L_{Aeq}
56.0 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
