

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P08BIS_CO_R-24.06.27**

Posizione

Via Morgagni civ.30

Data mis.: 27/06/2024

Ora inizio: 10:37:45

Ora fine: 11:37:45

Durata: 3600.0 sec

Microcantiere: **D1**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 27°C

Precipitazioni: /

Umidità: 60%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 73.0 dBA

Max = 103.3dBA

L50 = 62.6 dBA

Min = 45.9 dBA



L10 = 72.8 dBA

L95 = 50.0 dBA

Attività di cantiere: **nessuna**

Eventi generati dal cantiere: **passaggio macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

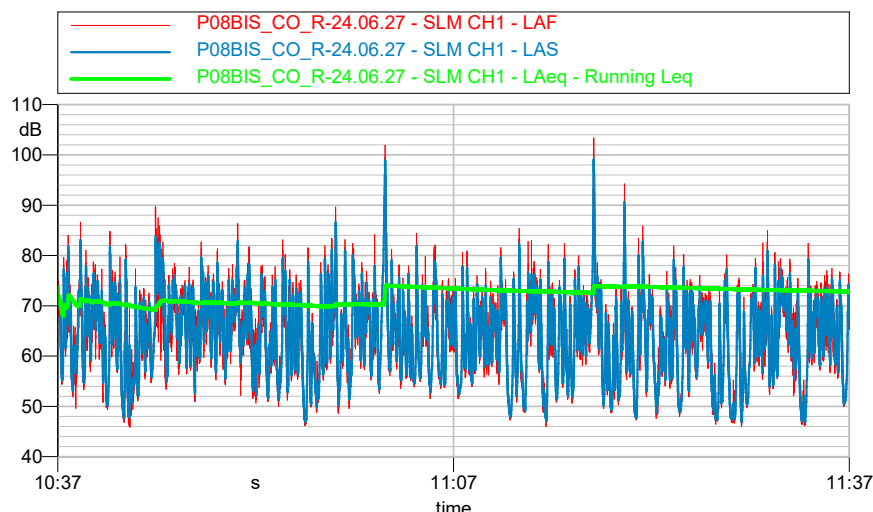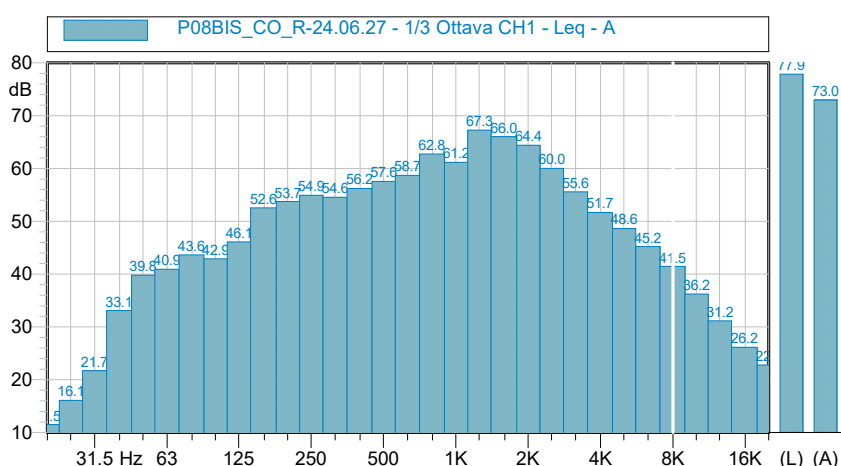

VALORE ANTE OPERA

LAeq
70 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
72.9 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
