

# CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P08\_CO\_V- 24.05.2801

Microcantiere: D1 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Via Morgagni civ.5

Data misura: 28/05/2024 Durata: 5590.3 sec Temperatura: 20°C

Ora inizio: 11:13:11 Precipitazioni: / Umidità: 79%

Ora fine: 12:46:21 Vento: inf. 5 m/s



## Attività di cantiere:




scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat,  
posa cavidotti e scarifica terreno

## Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

## Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

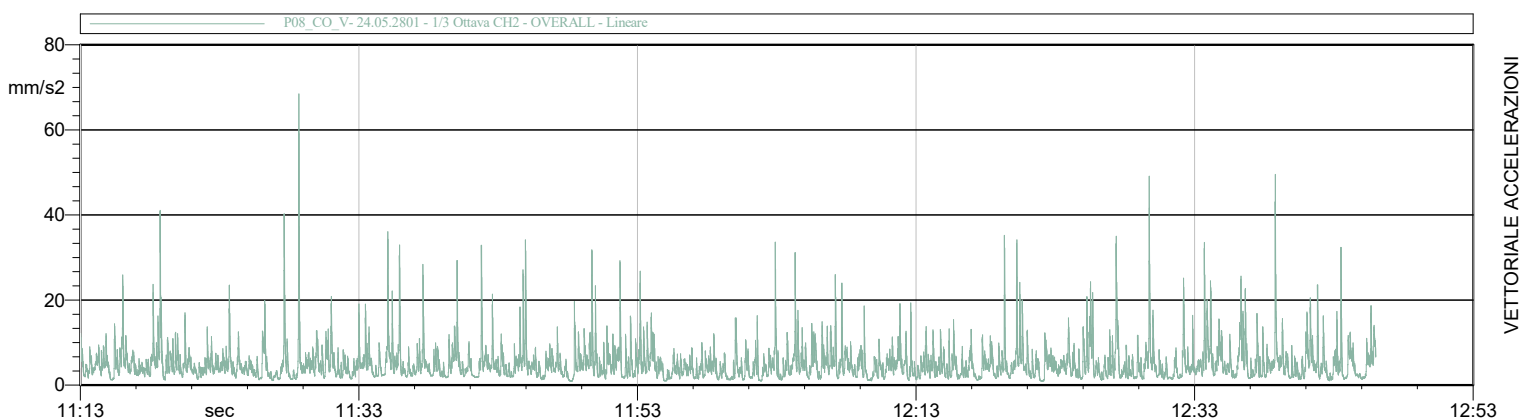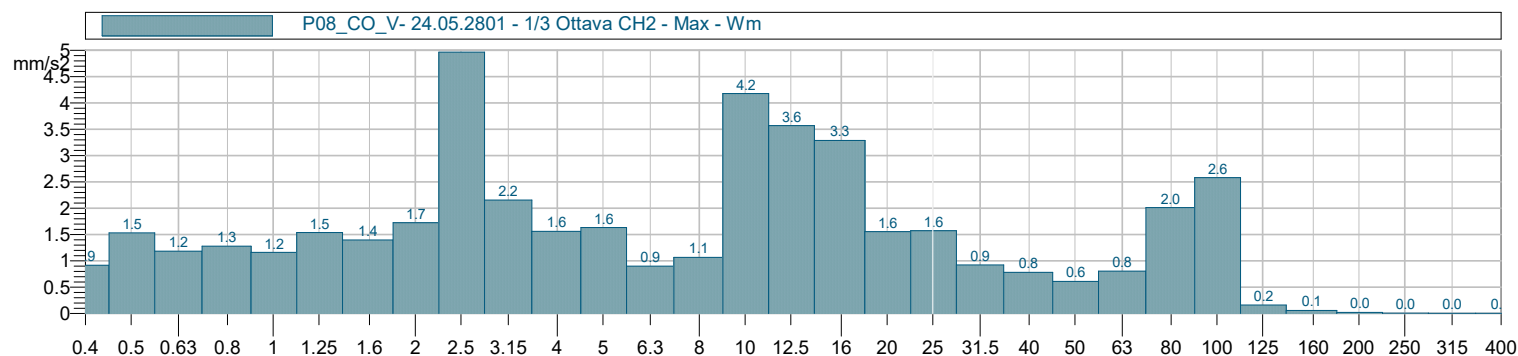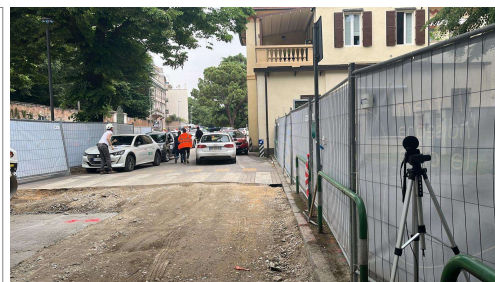

LIVELLO DI FONDO  
(Bianco)

0.9 mm/s²

VALORE MISURATO  
aw,95

6.4 mm/s²

LIMITE  
UNI 9614:2017  
ambienti ad  
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
