

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P08_CO_R- 24.05.2801**

Posizione

Via Morgagni civ.5

Data mis.: **28/05/2024**

Ora inizio: **11:13:11**

Ora fine: **12:46:21**

Durata: **5590.3 sec**

Microcantiere: **D1**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: **20°C**

Precipitazioni: **/**

Umidità: **79%**


Vento: **inf. 5 m/s**

Attività di cantiere: **scavi e spianamenti con escavatori e pale gommate, posa tubazione**



Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

P08_CO_R- 24.05.2801 - 1/3 Ottava CH1 - Leq - A

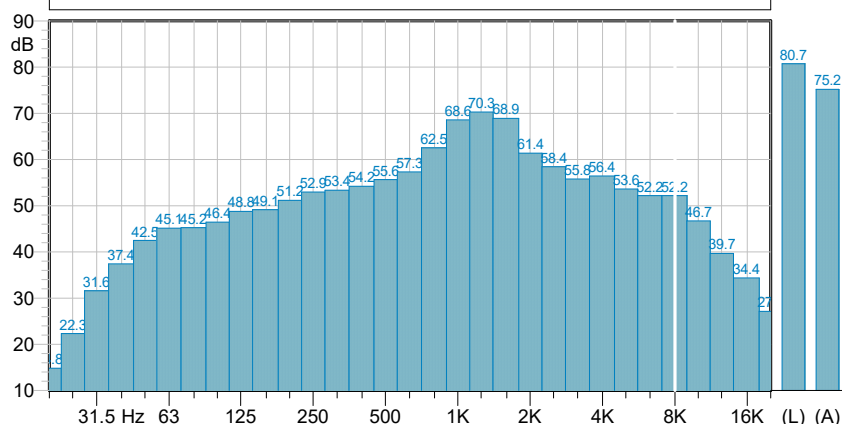

P08_CO_R- 24.05.2801 - SLM CH1 - LAF
P08_CO_R- 24.05.2801 - SLM CH1 - LAS
P08_CO_R- 24.05.2801 - SLM CH1 - LAeq - Running Leq

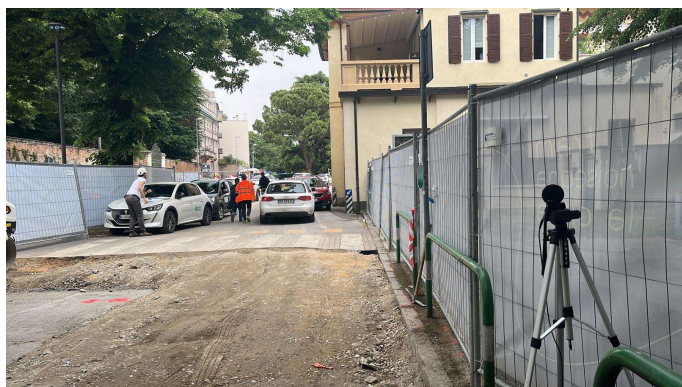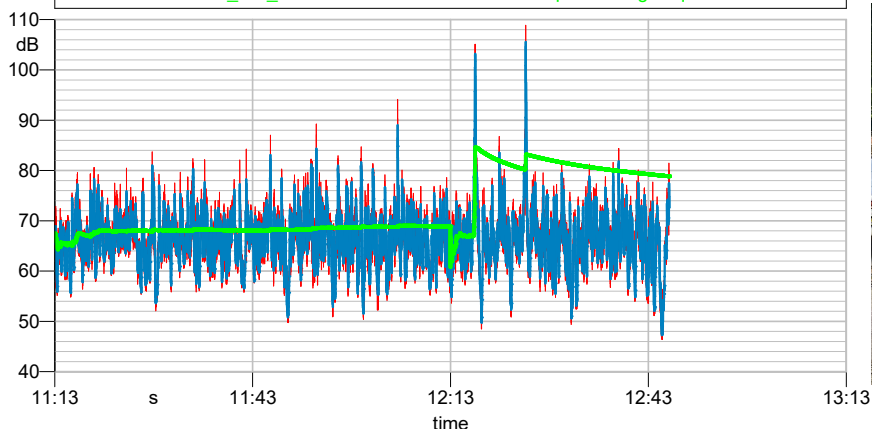

VALORE ANTE OPERA

LAeq
70 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
78.8 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
