

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P25-CO-R_2023.10.04**

Posizione

Liceo Statale A. Cornaro
Via Antonio Riccoboni

Data mis.: 03/10/2023

Ora inizio: 10:55:19

Ora fine: 11:23:03

Durata: 1664.7 sec

Microcantiere: **H3**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 24°C

Precipitazioni: /

Umidità: 65%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 71.5 dBA

Max = 82.0 dB

L50 = 69.1 dB

Min = 43.1 dB

L10 = 75.0 dB




L95 = 55.6 dB

Attività di cantiere: **opere di asfaltatura di un tratto di giunzione del cantiere**

Eventi generati dal cantiere: vibrofinitrice, autocarro con conglomerato e rullo compattatore

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

P25-CO-R_2023.10.04 - 1/3 Ottava CH1 - Leq - A

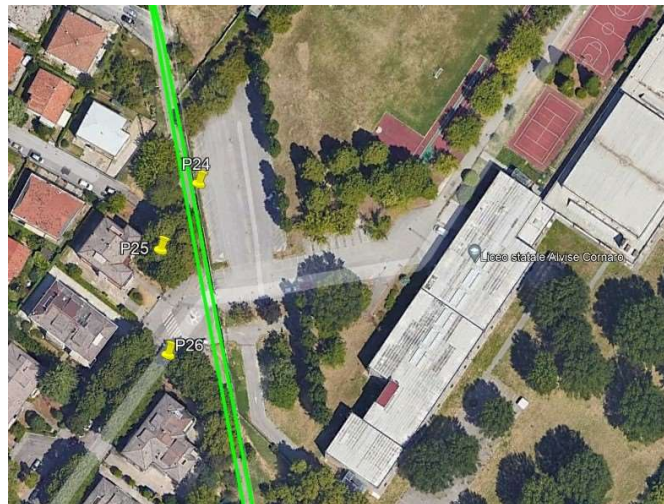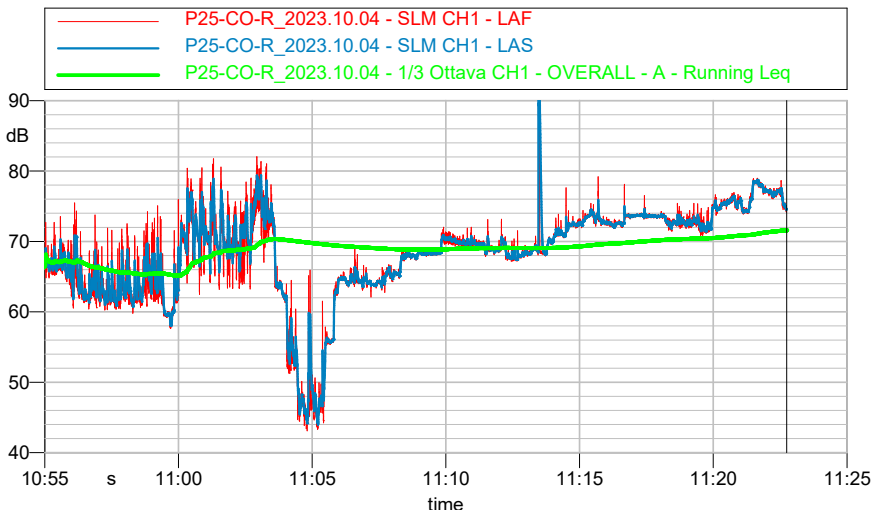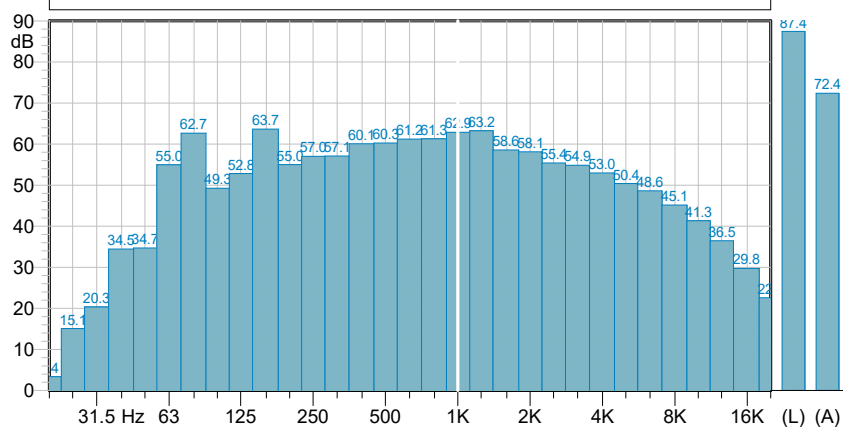

VALORE ANTE OPERA

LAeq
45 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
71.6 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
