

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P34TER_CO_R-24.06.11**

Posizione

Farmacia

Data mis.: 11/06/2024

Ora inizio: 14:02:33

Ora fine: 14:32:33

Durata: 1800.0 sec

Microcantiere: **L6**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 20°C

Precipitazioni: /

Umidità: 70%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 66.5dBA

Max = 81.9dBA

L50 = 63.7 dBA

Min = 45.8 dBA



L10 = 69.7 dBA

L95 = 49.7 dBA

Attività di cantiere: **nessuna**

Eventi generati dal cantiere: **nessuno**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

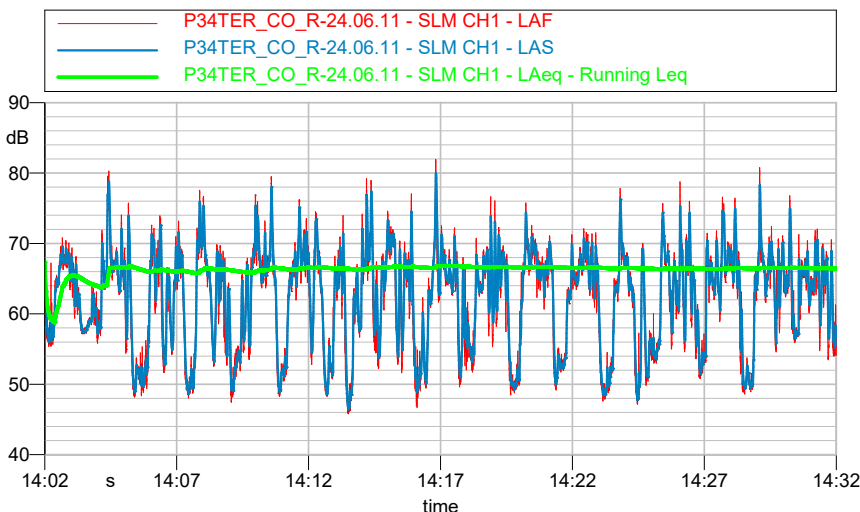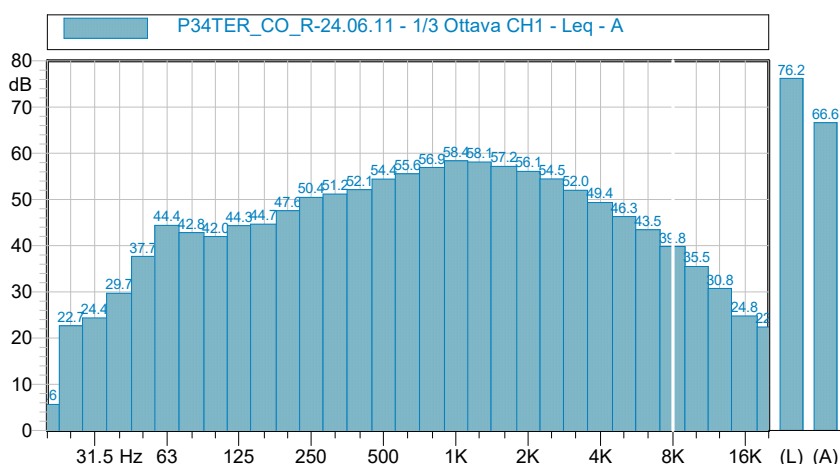

VALORE ANTE OPERA

LAeq
70 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
66.5 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
