

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P08-CO-R_24.05.14**

Posizione

Via Morgagni civ.5

Data mis.: 14/05/2024

Ora inizio: 14:13:09

Ora fine: 16:21:33

Durata: 7704.8 sec

Microcantiere: **D1**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 21°C

Precipitazioni: /

Umidità: 57%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 62.3 dBA

Max = 98.1 dBA

L50 = 61.0 dBA

Min = 45.8 dBA




L10 = 67.3 dBA

L95 = 51.9 dBA

Attività di cantiere: **scavi e spianamenti con escavatori e pale gommate, posa tubazione**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

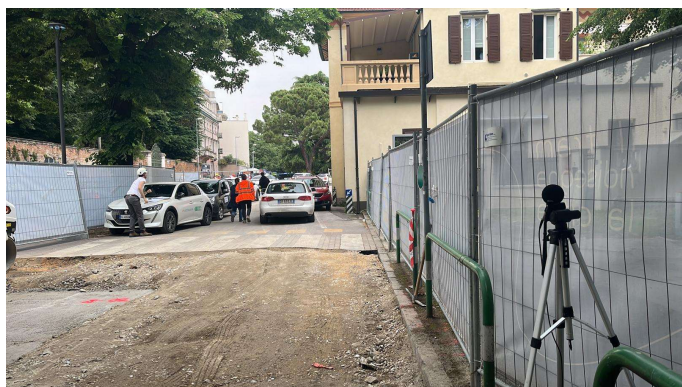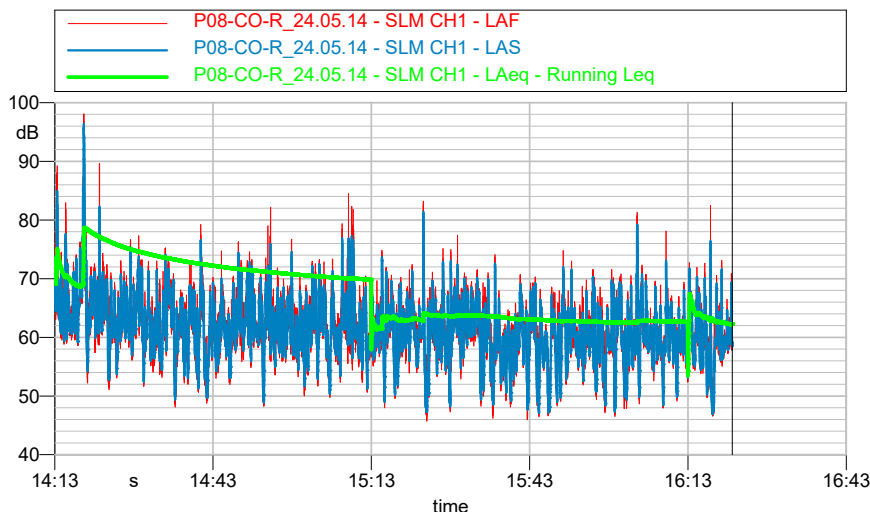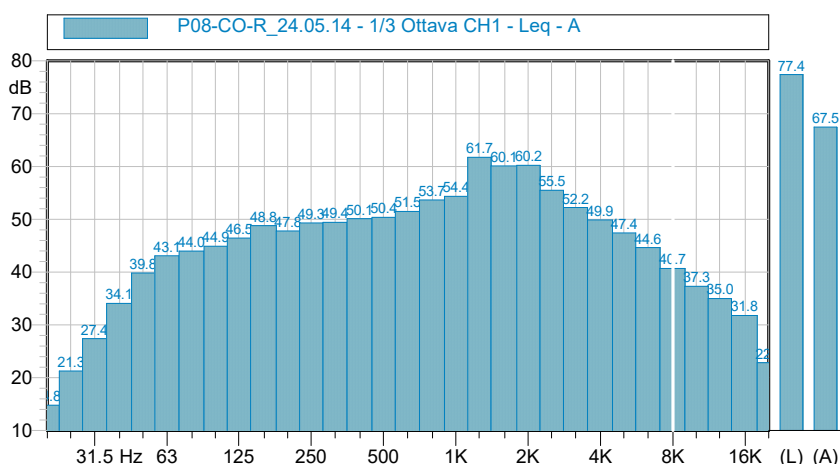

VALORE ANTE OPERA

**LAeq
70 dBA**

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

**LAeq
62.3 dBA**

LIMITE DI ZONA

**CLASSE IV
65 dBA**

NOTE
