

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P34_CO_R-24.06.11**

Posizione

R-store

Data mis.: 11/06/2024

Ora inizio: 14:36:00

Ora fine: 15:06:00

Durata: 1800.0 sec

Microcantiere: **L2**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 20°C

Precipitazioni: /

Umidità: 70%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 66.0 dBA

Max = 81.0 dBA

L50 = 63.4 dBA

Min = 45.7 dBA



L10 = 69.0 dBA

L95 = 52.2 dBA

Attività di cantiere: **nessuna**

Eventi generati dal cantiere: **nessuno**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

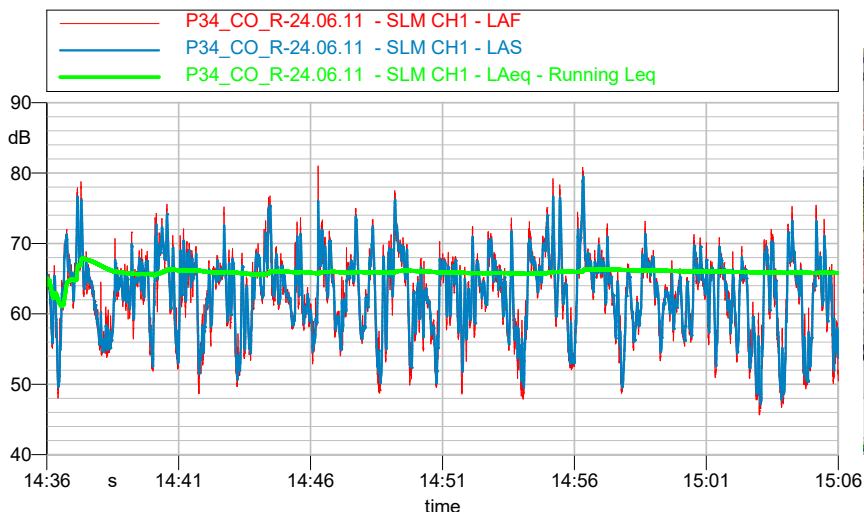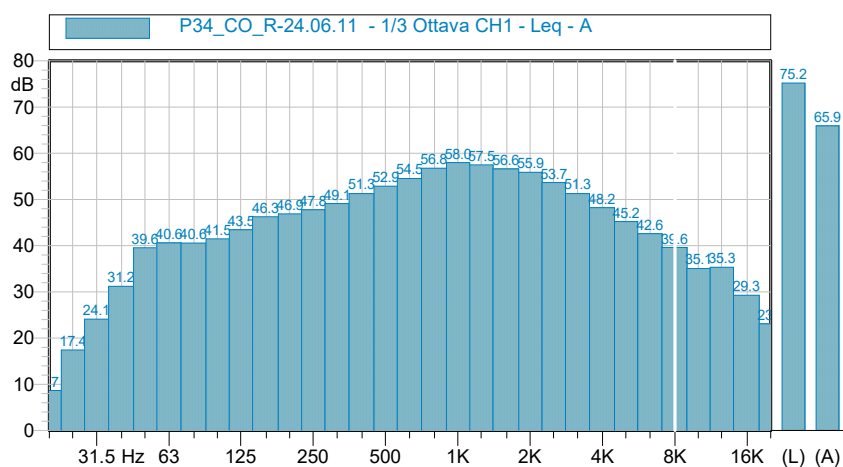

VALORE ANTE OPERA

LAeq
55 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
65.8 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
