

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA  
COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P41-CO-R 2024.11.19



Posizione **Deposito Voltabarozzo**

Data mis.: 19/11/2024	Microcantiere: <b>M</b>	Fase: <b>CORSO D'OPERA</b>			Temperatura: 9°C
Ora inizio: 14:22:44					Precipitazioni: /
Ora fine: 15:22:44	LAeq = 59.4 dB			Max = 80.6 dB	L50 = 58.4 dB
Durata: 3600.0 sec	Min = 52.9 dB			L10 = 61.8 dB	L95 = 55.5 dB
					Umidità: 71%
					Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere: **costruzione della struttura di deposito dei convogli tranviari, piazzali e binari di manovra**

Eventi generati dal cantiere: lav. con macchine operatrici, uso ple ed attrezzature manuali da carpenteria metallica

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

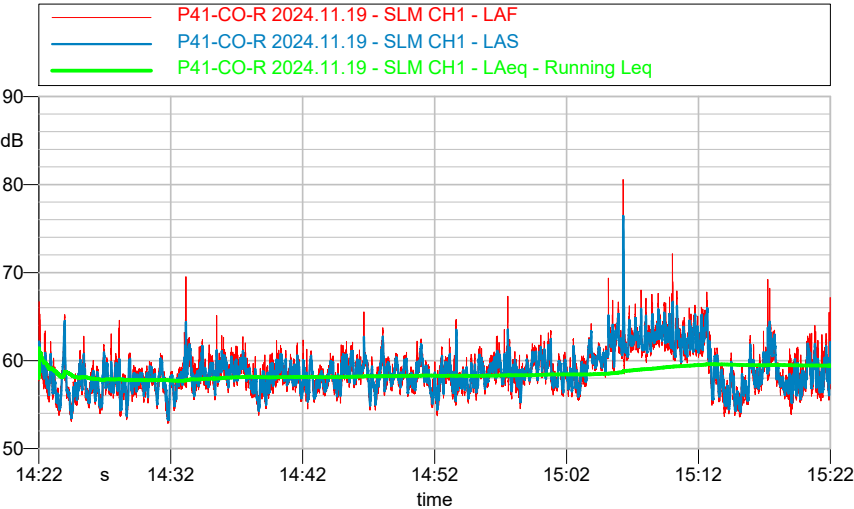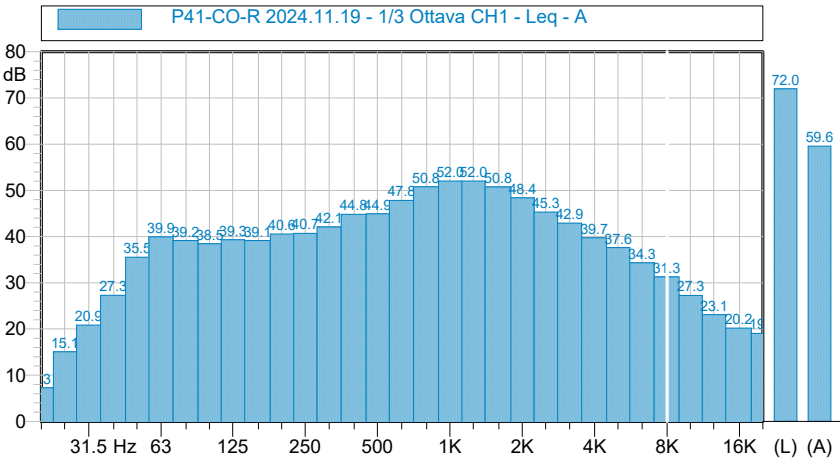

VALORE ANTE OPERA

**LAeq**

**55 dBA**

valore estratto da modelli di studio del clima acustico

VALORE CORSO D'OPERA MISURATO

**LAeq**

**59.4 dBA**

LIMITE DI ZONA

**CLASSE III**

**60 dBA**

NOTE
