

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P31-CO-V_2025.05.22

Microcantiere: I-3 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Lungargine Sabbionari

Data misura: 22/05/2025 Durata: 3684.6 sec Temperatura: 24°C

Ora inizio: 09:57:11 Precipitazioni: / Umidità: 59%

Ora fine: 10:58:35 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



lavorazioni di finitura sul ponte metallico e sulle vie di transito dei convogli

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine ed autocarri, lav.manuali

Eventi non generati dal cantiere:

livelli di fondo del traffico cittadino ed attività antropiche

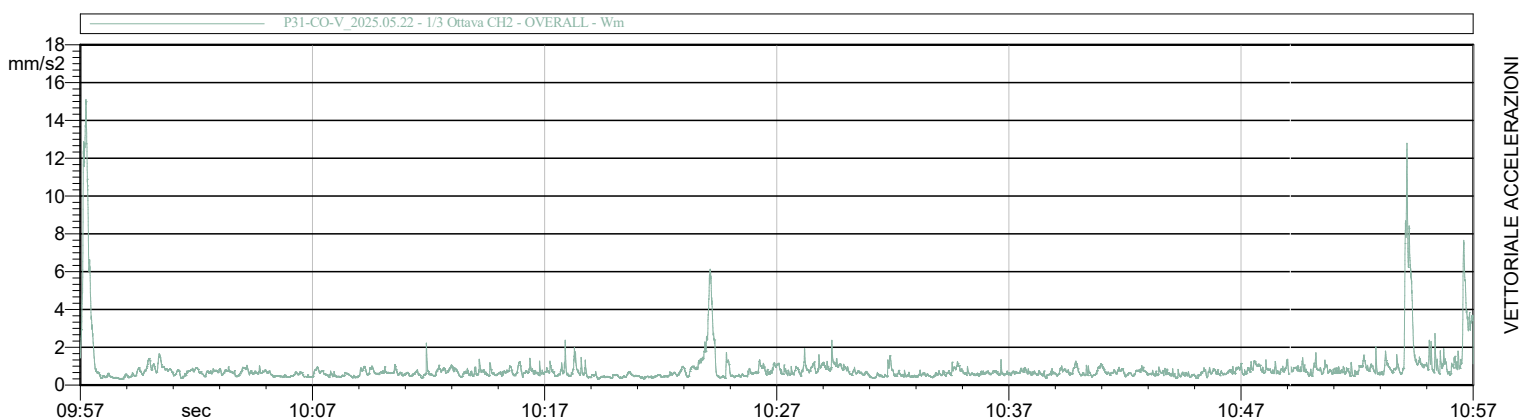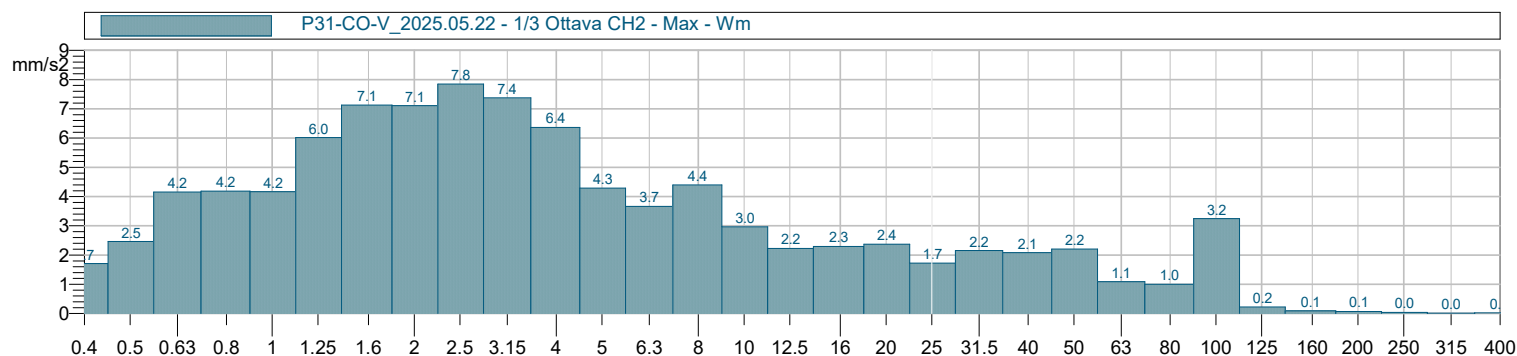

**LIVELLO DI FONDO
(Bianco)**

0.3 mm/s²

**VALORE MISURATO
aw,95**

1.3 mm/s²

**LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo**

7,2 mm/s²

NOTE
