

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P32-CO-R_2025.05.06**

Posizione

Lungargine Sabbionari
abitazione a sud

Data mis.: 06/05/2025

Ora inizio: 14:14:30

Ora fine: 15:29:17

Durata: 4487.6 sec

Microcantiere: **I-3**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 28°C

Precipitazioni: /

Umidità: 68%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 49.5 dB

Max = 69.1 dB

L50 = 48.3 dB

Min = 44.8 dB




L10 = 50.2 dB

L95 = 46.2 dB

Attività di cantiere: **finitura delle piste di transito dei convogli tranviari**

Eventi generati dal cantiere: posa materiale, pali di alimentazione e sistemi di controllo, movimentazione materiali

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

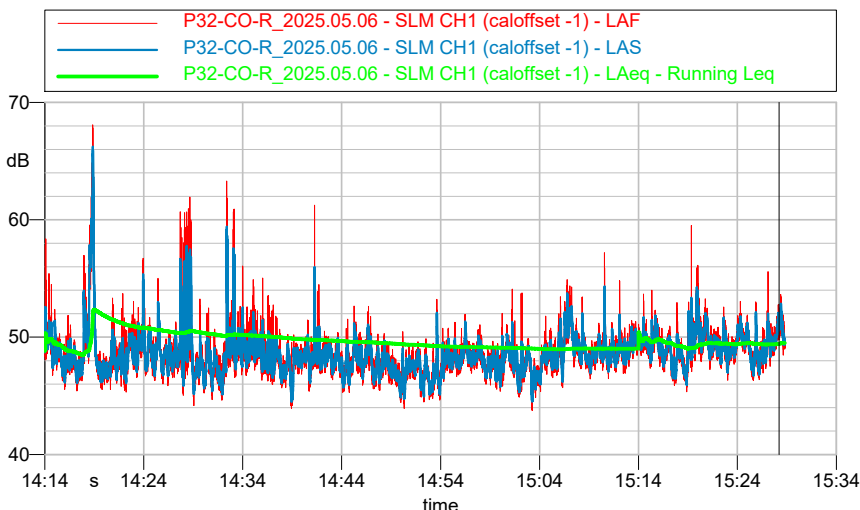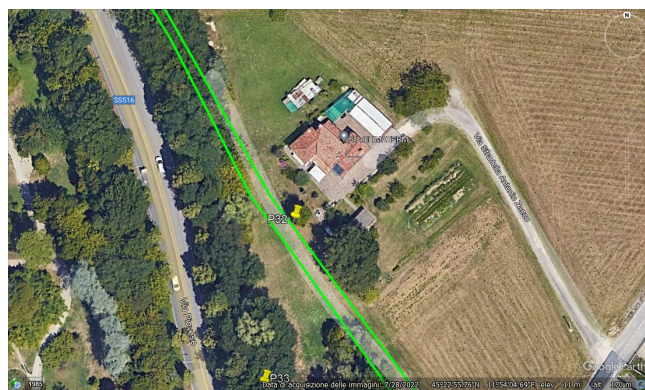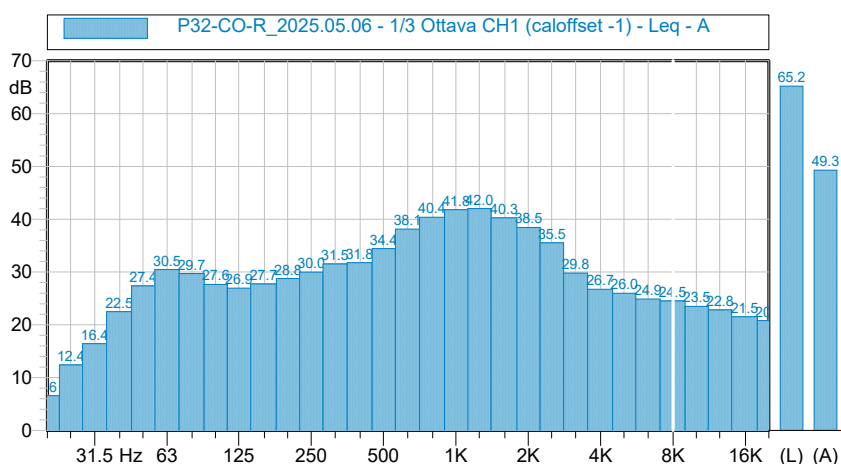

VALORE ANTE OPERA

LAeq
55 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
49.1 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
