

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P12bis-CO-V_2025.08.29

Microcantiere: F2 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Rotatoria tra Via Giustiniani e Via Gattamelata

Data misura: 29/08/2025 Durata: 2949.2 sec Temperatura: 21°C

Ora inizio: 10:32:59 Precipitazioni: / Umidità: 80%

Ora fine: 11:22:08 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:




stesura del conglomerato bituminoso di sottofondo, livellamento

Eventi generati dal cantiere:

sollevamento e posa conglomerato, spianamento con rullo compressore

Eventi non generati dal cantiere:

valori vibratori di fondo correlati solo al traffico veicolare

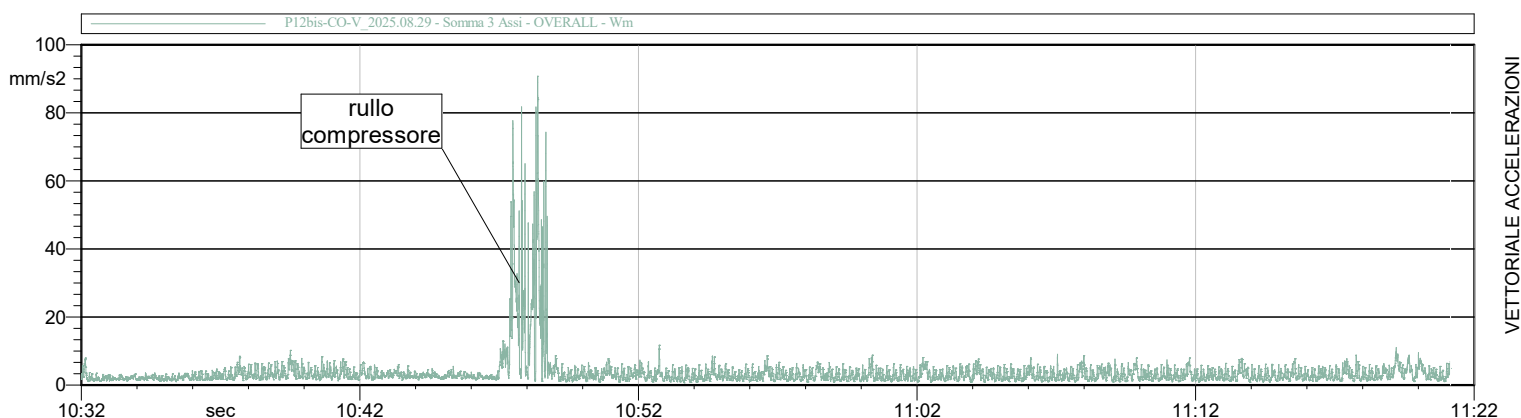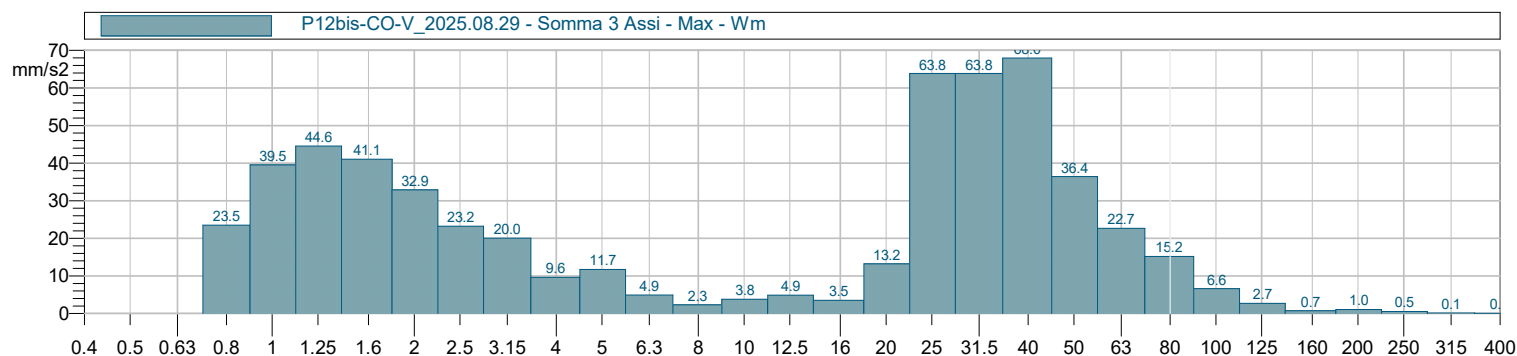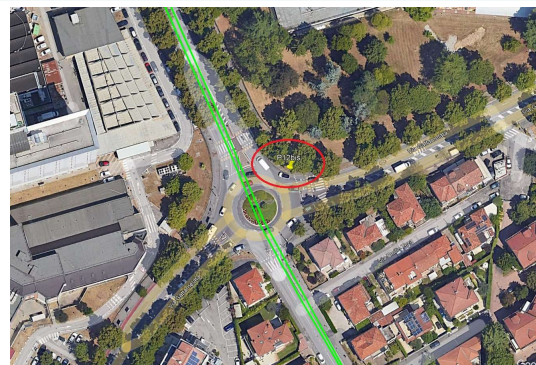

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.7 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

6.2 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE

eventi
fortemente
vibratori
dovuti al rullo
compressore
