

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P34Bis-CO-V_2025.08.06

Microcantiere: L-6 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Piazza Santi Piero e Paolo - quartiere Voltabarozzo

Data misura: 06/08/2025 Durata: 3915.2 sec Temperatura: 23°C

Ora inizio: 10:52:00 Precipitazioni: / Umidità: 61%

Ora fine: 11:57:15 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:


posa e legatura del ferro di arco delle corsie di transito

Eventi generati dal cantiere:

movimentazione di materiale metallico, barre e strutture prefabbricate

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

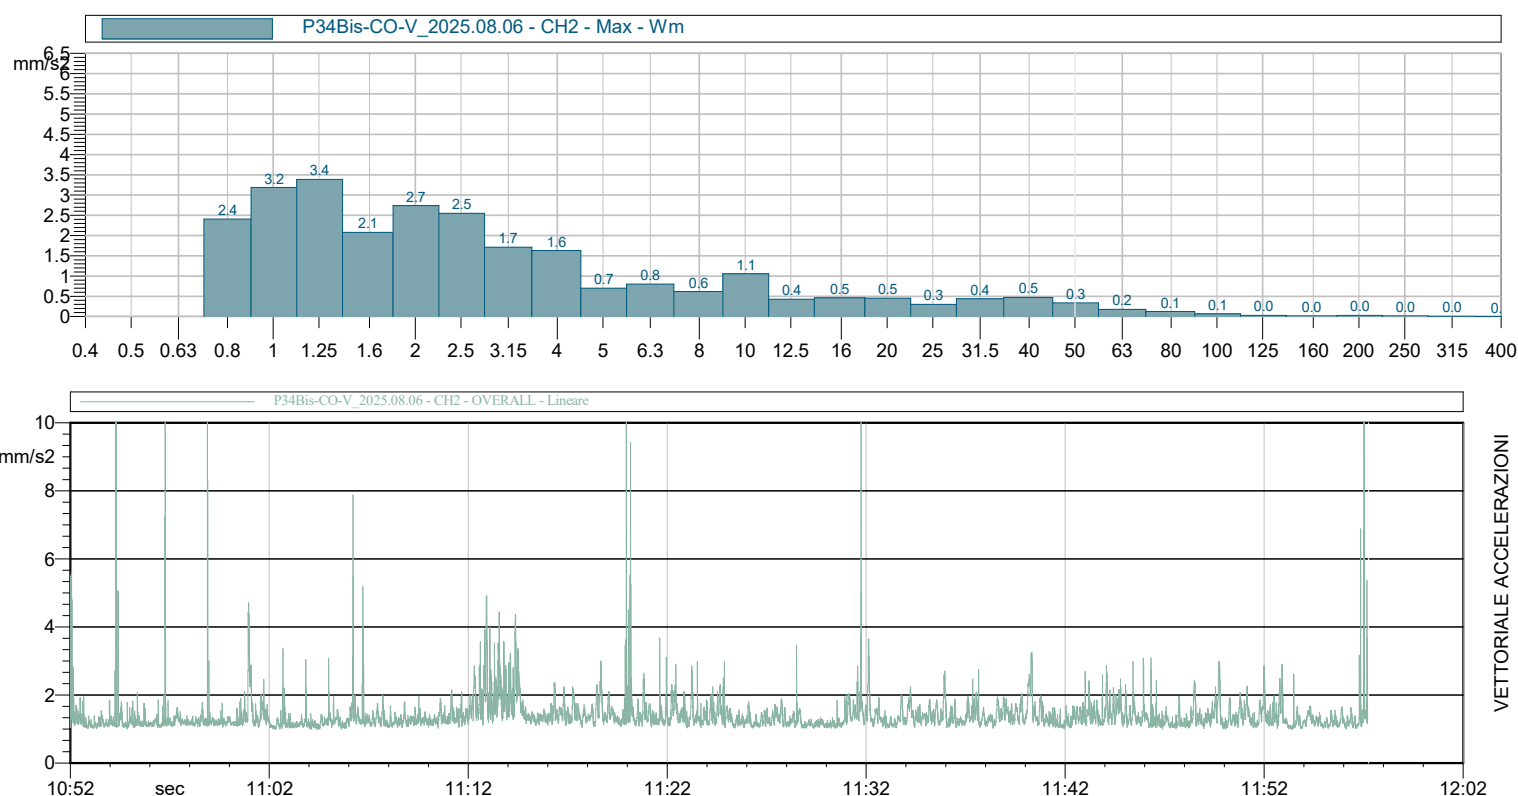

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.0 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

1.4 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
