

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39BIS_CO_R_2026.04.16**

Posizione **Capolinea Dep. Voltabarozzo**

Data mis.: 16/04/2026

Ora inizio: 11:00:12

Ora fine: 11:59:20

Durata: 3548.1 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 22°C

Precipitazioni: /

Umidità: 74%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 64.1 dBA

Max = 82.1 dB

L50 = 62.3 dB

Min = 47.7 dB





L10 = 67.1 dB

L95 = 54.9 dB

Attività di cantiere: **intense lavorazioni nel deposito, sia all'interno della struttura che sulle aree scoperte**

Eventi generati dal cantiere: **movimentazione di molte merci con mezzi d'opera, traffico di macchine operatrici**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

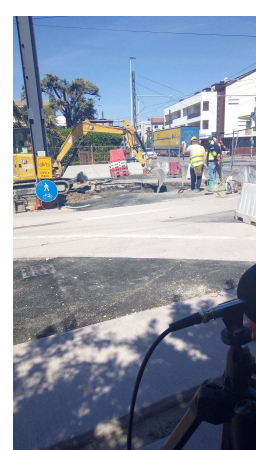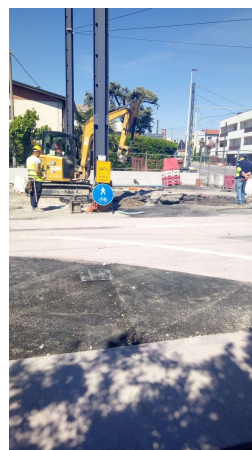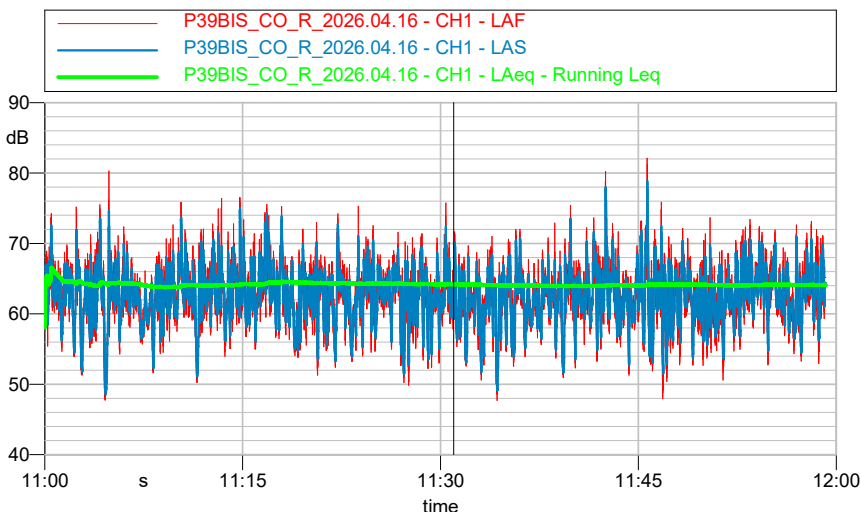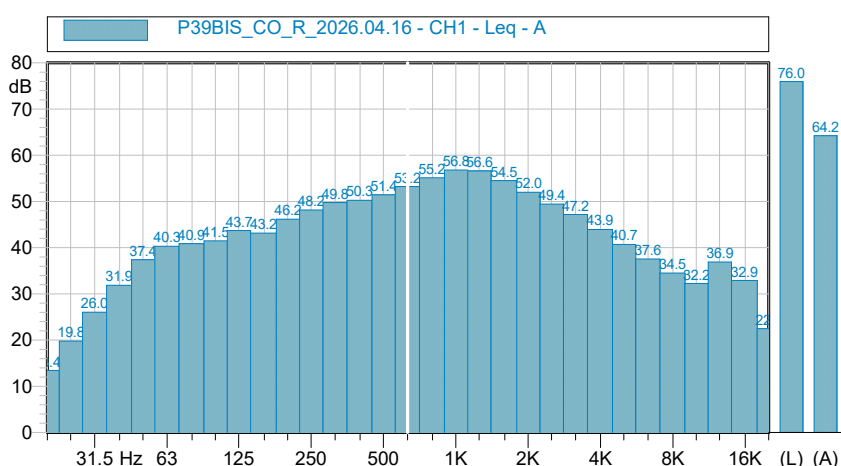

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
64.1 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
