

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39BIS_CO_R_2026.04.23**

Posizione **Capolinea Voltabarozzo**

Data mis.: 23/04/2026

Ora inizio: 10:00:13

Ora fine: 10:59:20

Durata: 3547.6 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 18°C

Precipitazioni: /

Umidità: 58%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 70.6 dBA

Max = 93.2 dB

L50 = 66.5 dB

Min = 50.6 dB



L10 = 72.4 dB

L95 = 60.6 dB

Attività di cantiere: **intense lavorazioni sia sulla strada che sui marciapiedi verso il deposito**

Eventi generati dal cantiere: **movimentazione di molte merci con mezzi d'opera, traffico di macchine operatrici**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

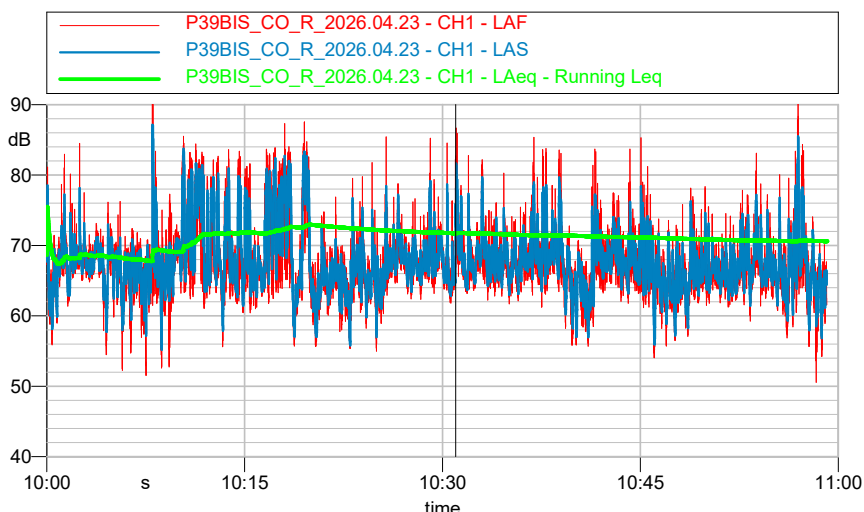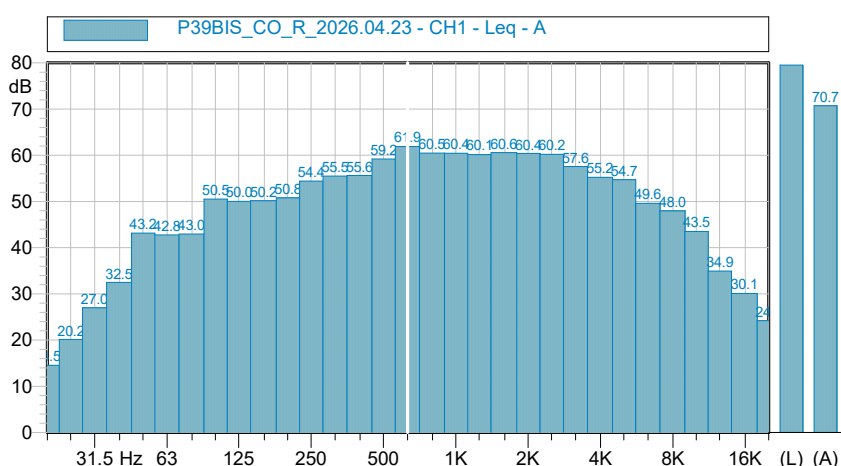

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
70.6 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
