

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P39BIS_CO_V_2026.04.16

Microcantiere: M Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Capolinea deposito Voltabarozzo

Data misura: 16/04/2026 Durata: 3548.1 sec

Ora inizio: 11:00:12 Precipitazioni: / Temperatura: 22°C

Ora fine: 11:59:20 Vento: inf. 5 m/s Umidità: 74%

Attività di cantiere:




intense lavorazioni nel deposito, sia all'interno della struttura che sulle aree scoperte

Eventi generati dal cantiere:

movimentazione di mezzi d'opera, traffico di macchine operatrici

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

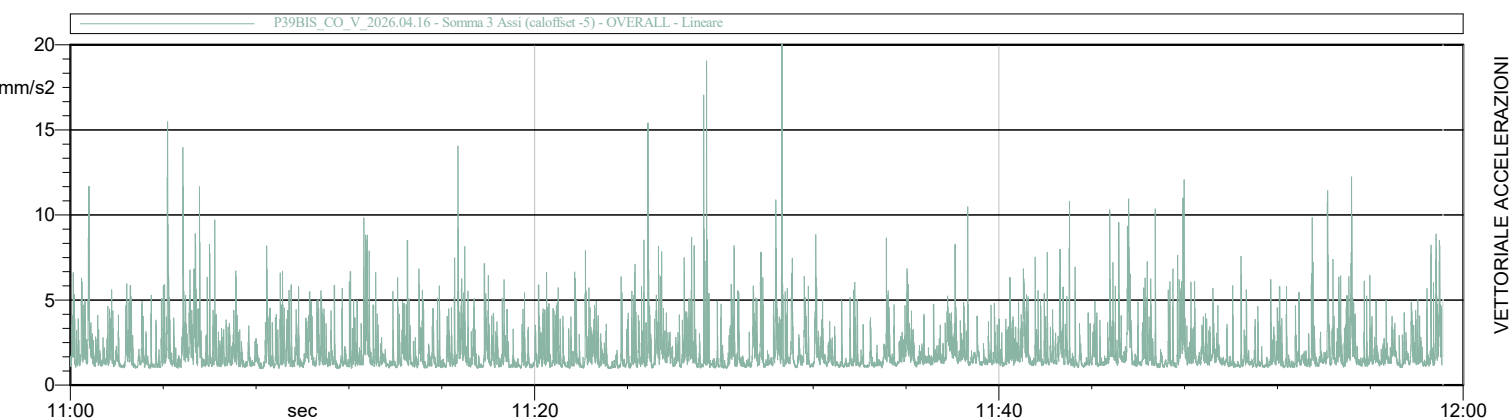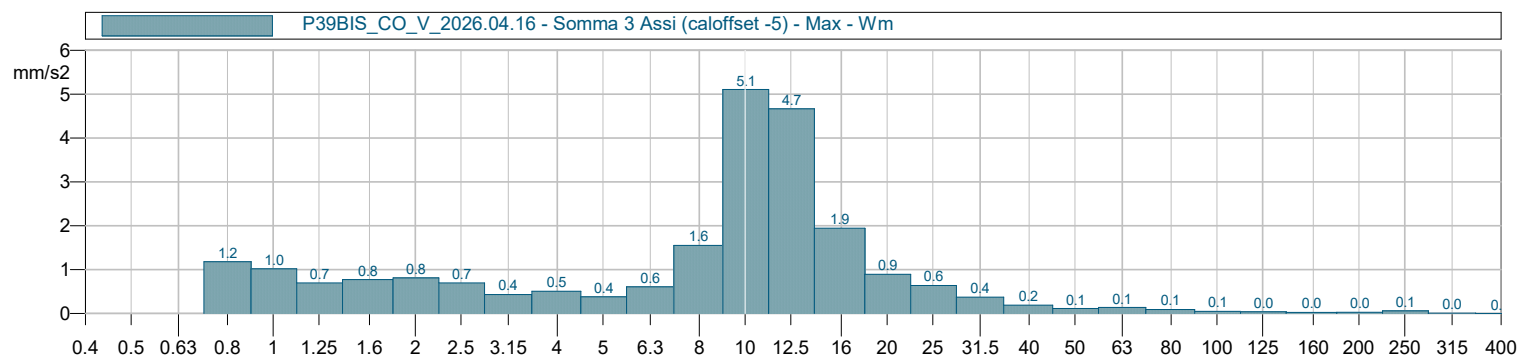

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.1 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

19.1 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
tutti gli eventi
sono correlati
alle attività di
cantiere, picchi di
brevissima durata
