

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P02-CO-R_2026.05.27**

Posizione **Rotatoria tra Via della Pace e P.le Stazione**

Data mis.: 27/05/2026

Ora inizio: 09:17:00

Ora fine: 10:17:00

Durata: 3600.0 sec

Microcantiere: **A1**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 27°C

Precipitazioni: /

Umidità: 68%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 72.8 dBA

Max = 103.3 dBA

L50 = 62.6 dBA

Min = 45.9 dBA





L10 = 72.8 dBA

L95 = 50.1 dBA

Attività di cantiere: **posa delle polifore, dei corrugati e dei pozzetti di ispezione per i cavi elettrici**

Eventi generati dal cantiere: lavorazioni prettamente manuali e piccoli lavori con attrezzi a batteria

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

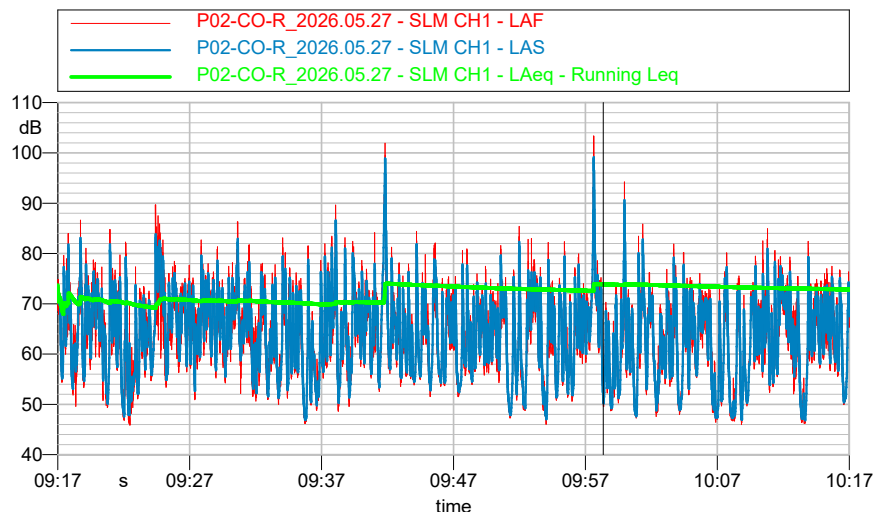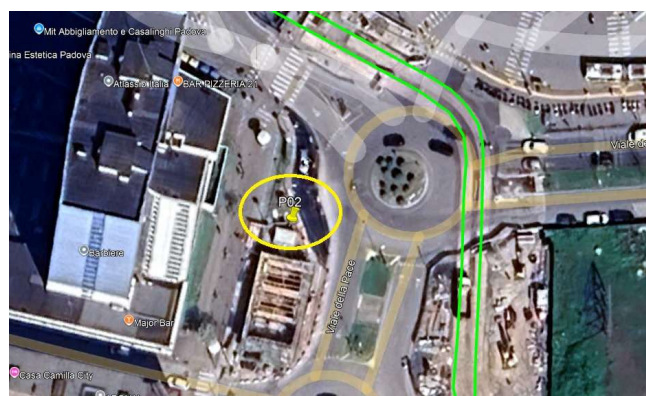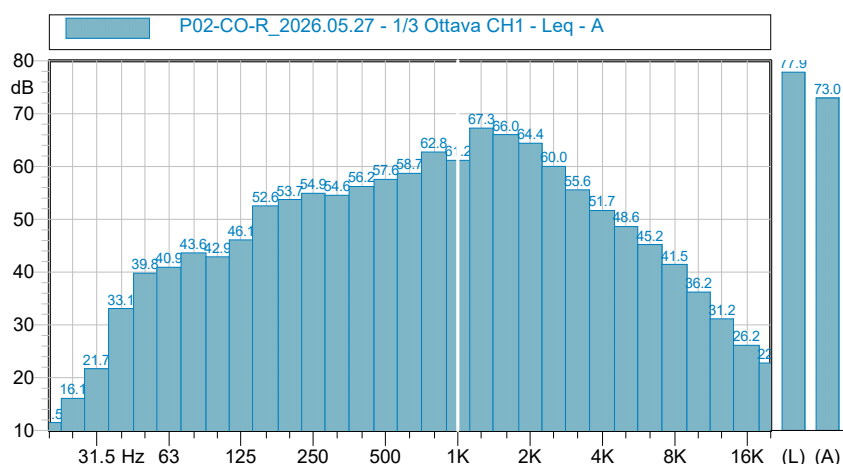

VALORE ANTE OPERA

LAeq
55 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
72.8 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE

preponderante
rumore del
traffico cittadino
