

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P39BIS_CO_V_2026.05.12

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Capolinea deposito Voltabarozzo**

Data misura: 12/05/2026 Durata: 3547.5 sec

Ora inizio: 11:00:13 Precipitazioni: / Temperatura: 19°C

Ora fine: 11:59:20 Vento: inf. 5 m/s Umidità: 75%

Attività di cantiere:



intense lavorazioni di finitura della strada e dei marciapiedi

Eventi generati dal cantiere:

movimentazione di mezzi d'opera, traffico di macchine operatrici

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

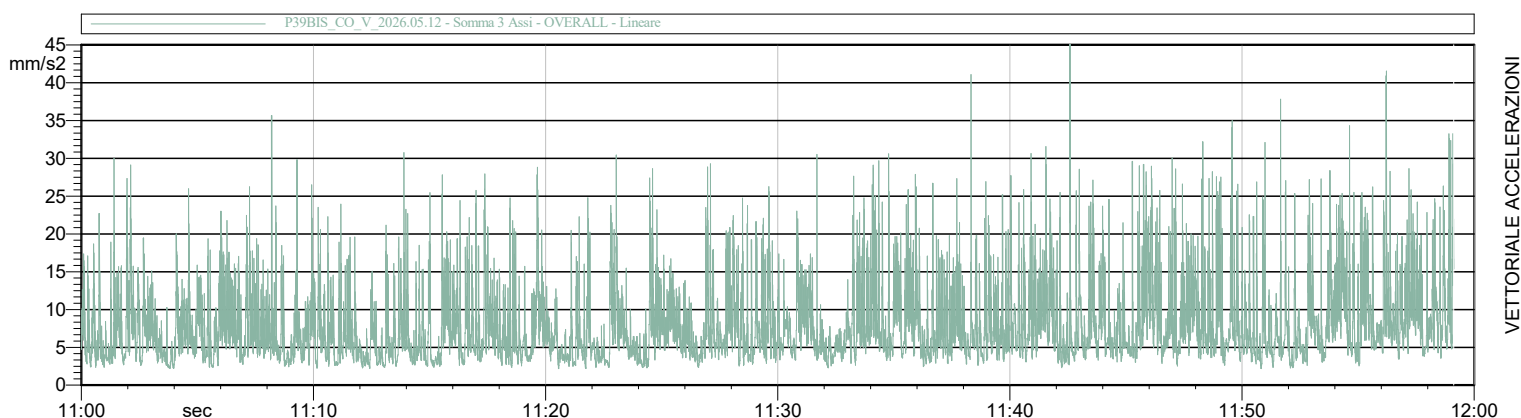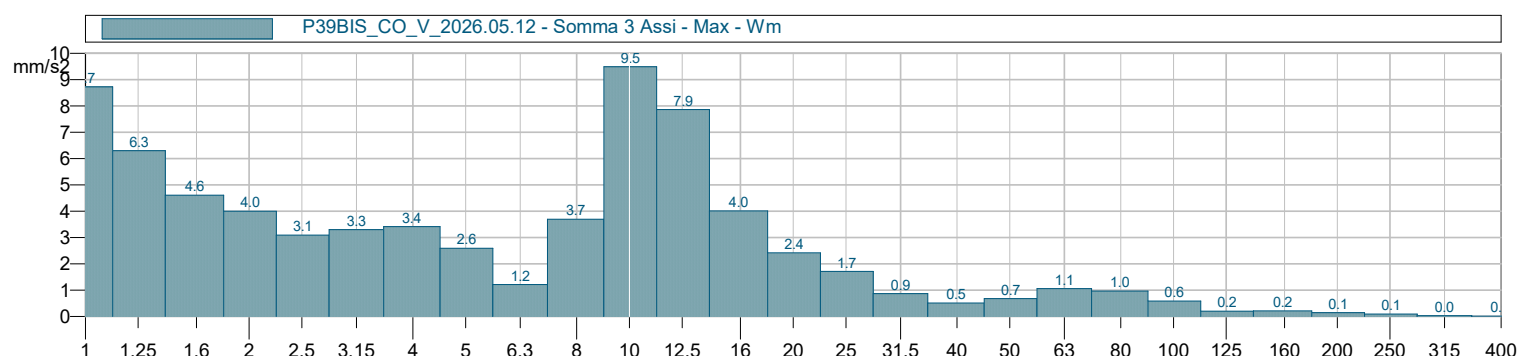

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.2 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

41.5 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
tutti gli eventi
sono correlati
alle attività di
cantiere, picchi di
brevissima durata
