

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39_CO_R_2026.05.12**

Posizione **Capolinea Dep. Voltabarozzo**

Data mis.: 12/05/2026

Ora inizio: 13:10:36

Ora fine: 14:00:43

Durata: 3007.6 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 19°C

Precipitazioni: /

Umidità: 75%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 58.9 dBA

Max = 88.9 dBA

L50 = 58.1 dBA

Min = 53.6 dBA



L10 = 60.2 dBA

L95 = 55.7 dBA

Attività di cantiere: **finitura del deposito convogli tranviari, posa prefabbricati metallici ed altre strutture**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni soprattutto con PLE ed attrezzature di sollevamento cose/persona**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e della officina meccanica confinante**

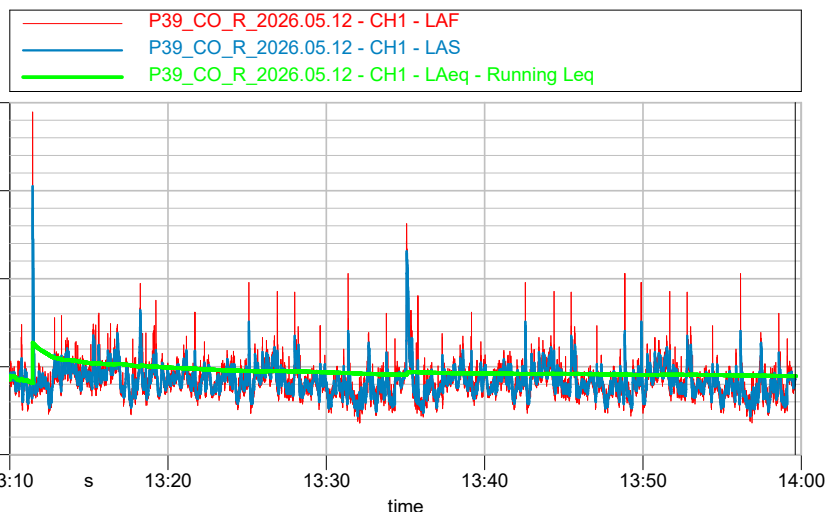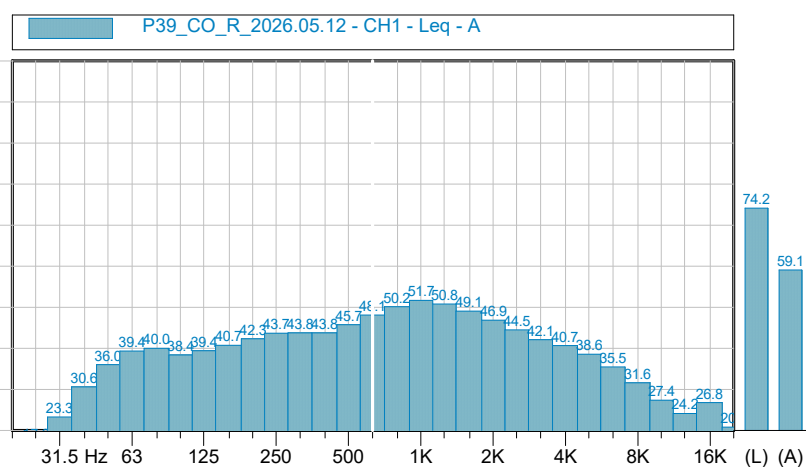

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
58.9 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
