

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P34_CO_R_2026.06.09**

Posizione

Fermata NANI
quartiere Voltabarozzo

Data mis.: 09/06/2026

Ora inizio: 09:00:09

Ora fine: 09:59:19

Durata: 3550.7 sec

Microcantiere: **L-2**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 29°C

Precipitazioni: /

Umidità: 74%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 72.8 dB

Max = 103.7 dB

L50 = 67.6 dB

Min = 56.8 dB




L10 = 73.5 dB

L95 = 55.2 dB

Attività di cantiere: **finitura delle piste di transito e delle opere accessorie**

Eventi generati dal cantiere: **movim. di materiale in genere, strutture prefabbricate ed altre componenti**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

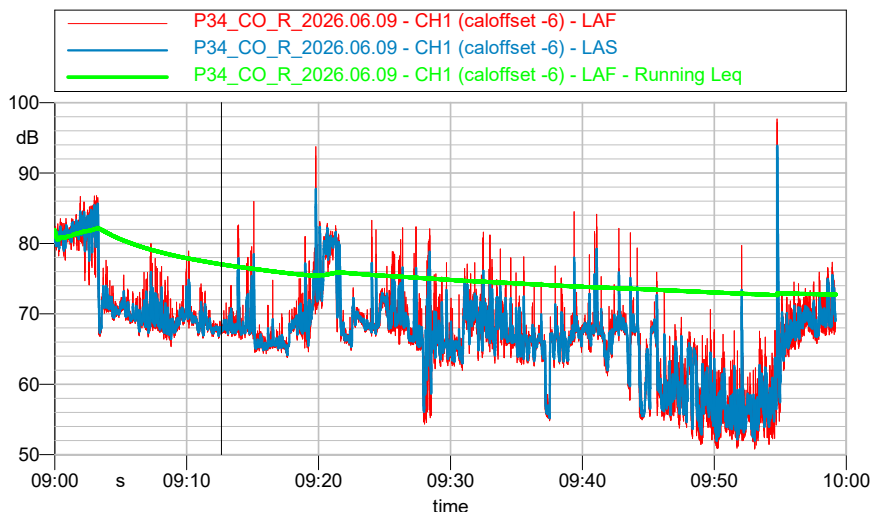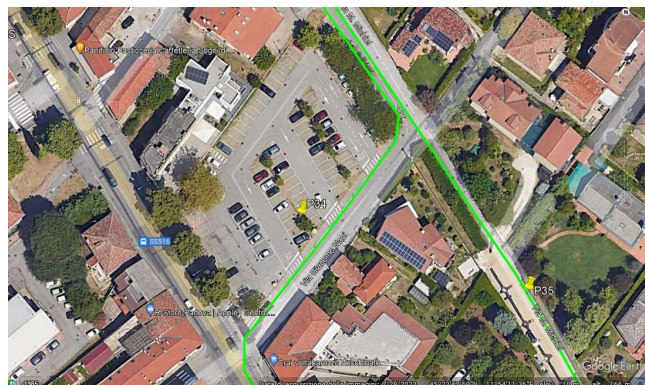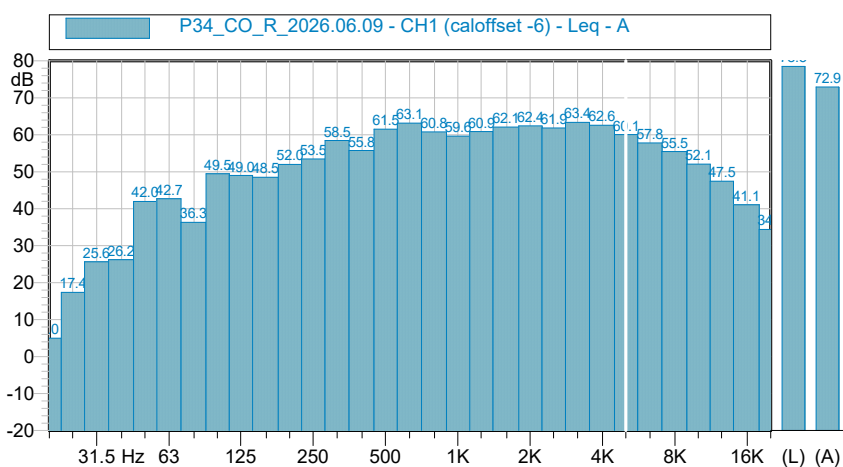

VALORE ANTE OPERA

LAeq
70 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
72.8 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
