

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39_CO_R_2026.06.10**

Posizione **Capolinea Dep. Voltabarozzo**

Data mis.: 10/06/2026

Ora inizio: 13:00:11

Ora fine: 13:59:20

Durata: 3549.4 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 26°C

Precipitazioni: /

Umidità: 87%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 58.4 dBA

Max = 79.5 dBA

L50 = 56.2 dBA

Min = 50.5 dBA



L10 = 59.6 dBA

L95 = 53.1 dBA

Attività di cantiere: **formazione dell'armatura e getto di una piccola platea in cls**

Eventi generati dal cantiere: maggior parte lavorazioni manuali, fase corta di getto del cls a metà misura

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e della officina meccanica confinante

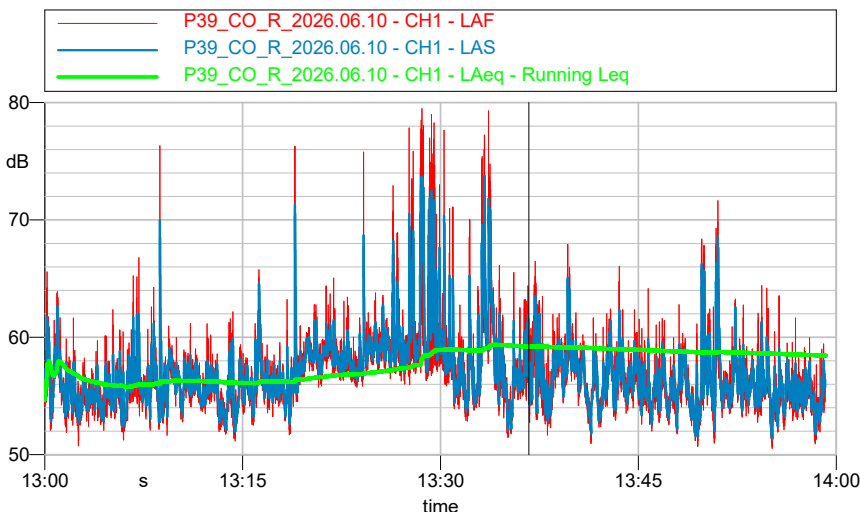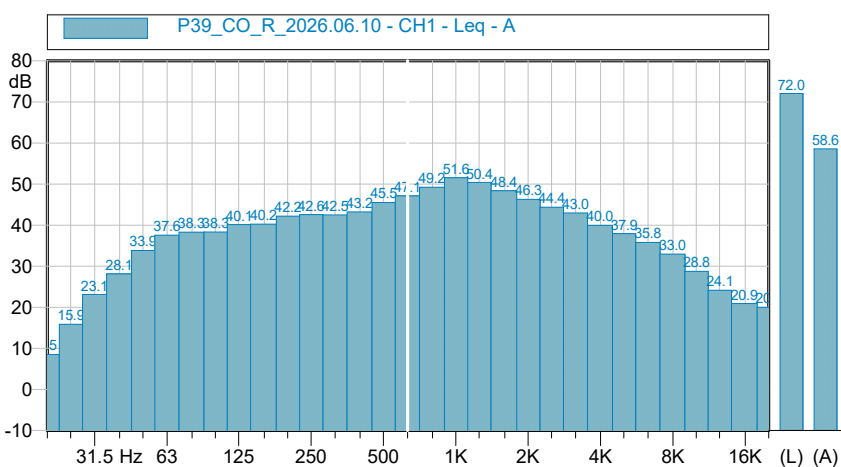

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
58.4 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE

l'evento a metà
del campionamento
è dovuto all'attività
di getto del cls
