

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P39_CO_V_2026.06.10

Microcantiere: M Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Capolinea deposito Voltabarozzo

Data misura: 10/06/2026 Durata: 3549.4 sec

Ora inizio: 13:00:11 Precipitazioni: / Temperatura: 26°C

Ora fine: 13:59:20 Vento: inf. 5 m/s Umidità: 87%

Attività di cantiere:


formazione dell'armatura e getto di una piccola platea in cls

Eventi generati dal cantiere:

maggior parte lavorazioni manuali, stesura del getto a metà misura

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico e della officina meccanica confinante

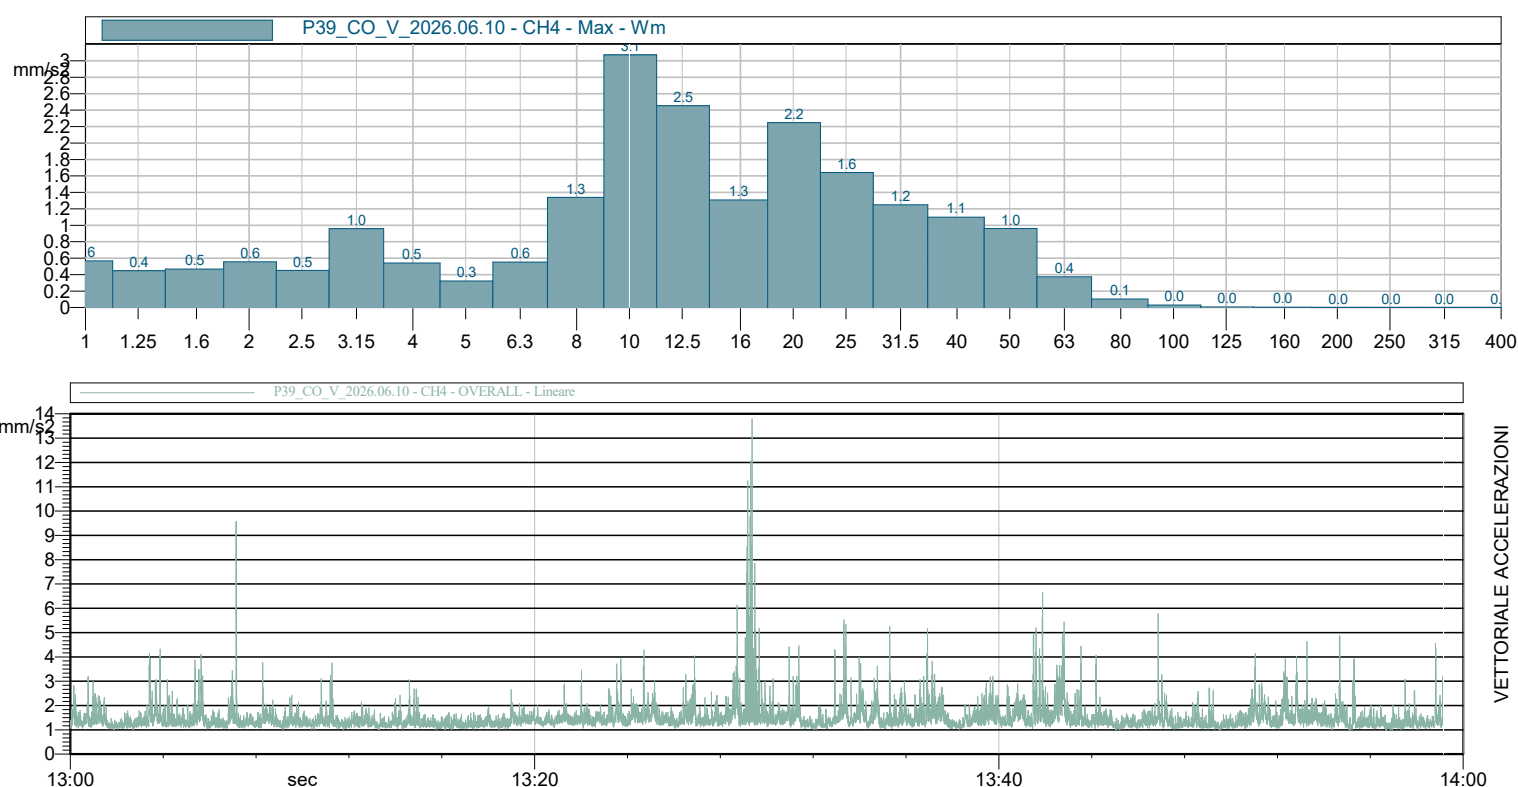

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.0 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

13.8 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE

l'evento a metà
del campionamento
è dovuto all'attività
di getto del cls
