

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P41_CO_R_2026.06.09**

Posizione

Deposito Voltabarozzo

Data mis.: 09/06/2026

Ora inizio: 13:00:12

Ora fine: 13:59:23

Durata: 3551.5 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 26°C

Precipitazioni: /

Umidità: 87%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 62.9 dB

Max = 87.1 dB

L50 = 59.9 dB

Min = 52.8 dB



L10 = 65.1 dB

L95 = 55.6 dB

Attività di cantiere: **fasi di finitura del deposito dei convogli tranviari, piazzali e binari di manovra**

Eventi generati dal cantiere: lav. con macchine operatrici, uso ple ed attrezzature manuali da carpenteria metallica

Eventi non generati dal cantiere: valori di fondo dovuti oerlopiù al traffico sulla tangenziale

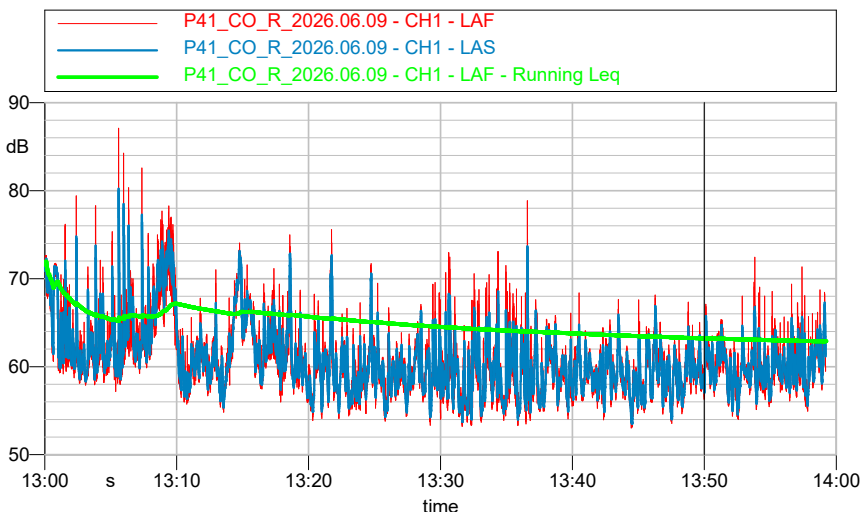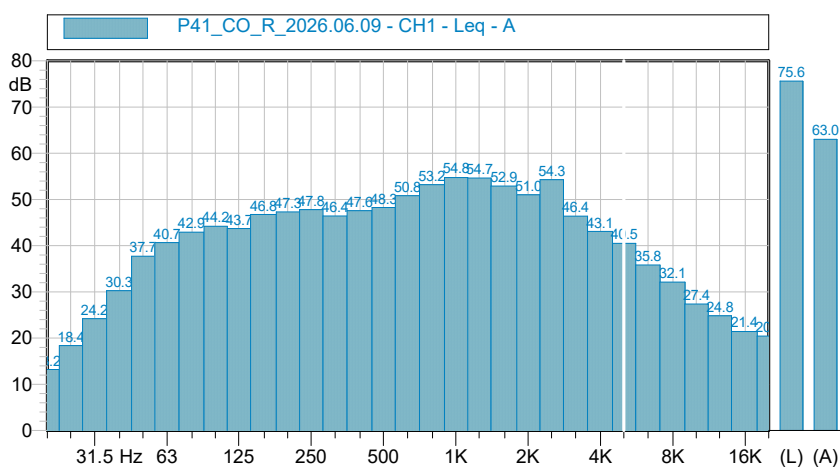

VALORE ANTE OPERA

LAeq
55 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
62.9 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
