

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P02_CO_R_2026.01.22

Posizione Rotatoria tra Via della Pace e P.le Stazione

Data mis.: 22/01/2026

Ora inizio: 15:20:22

Ora fine: 16:20:22

Durata: 3600.0 sec

Microcantiere: A1

Fase: CORSO D'OPERA

Temperatura: 7°C

Precipitazioni: /

Umidità: 64%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 65.9 dBA

Max = 86.8 dBA

L50 = 52.9 dBA

Min = 33.3 dBA




L10 = 67.0 dBA

L95 = 41.4 dBA

Attività di cantiere: ultime lavorazioni di finitura diurne e sistemazione aree

Eventi generati dal cantiere: lavorazioni prettamente manuali e piccoli lavori con attrezzi a batteria

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

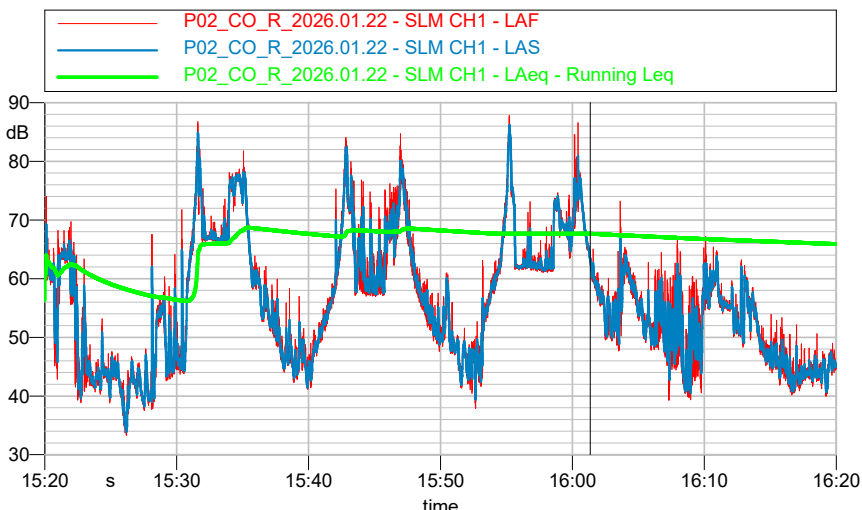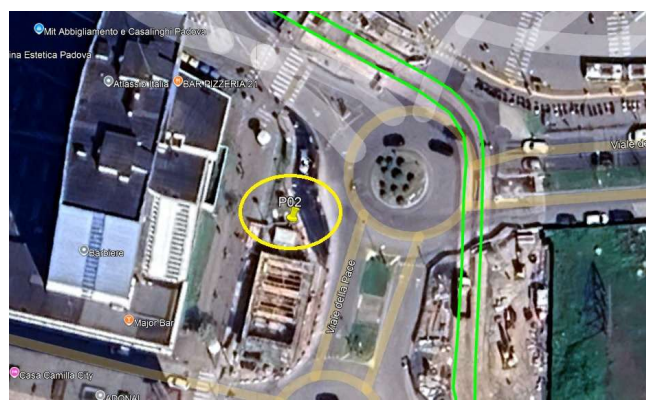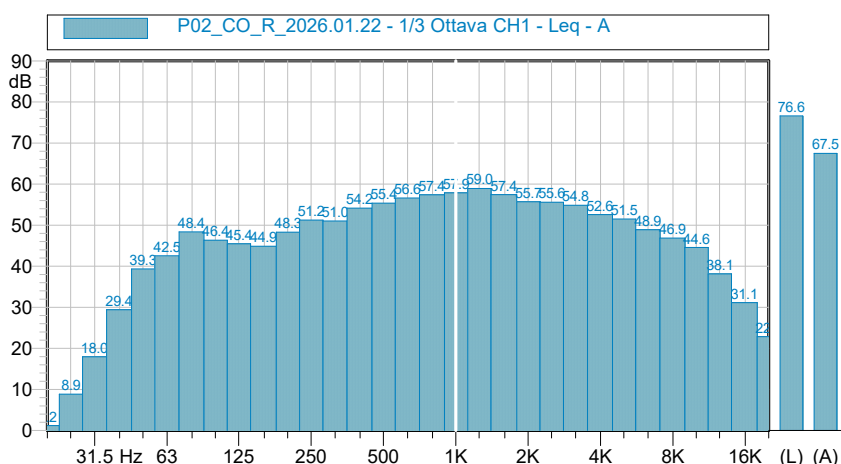

VALORE ANTE OPERA

LAeq
55 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

**VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO**

LAeq
65.9 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE

preponderante
rumore delle
attività di cantiere
