

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P4_CO_R_2026.01.13**

Posizione **Via Niccolò Tommaseo**

Data mis.: 13/01/2026

Ora inizio: 10:32:56

Ora fine: 11:21:08

Durata: 2892.5 sec

Microcantiere: **A2**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 5°C

Precipitazioni: /

Umidità: 84%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 60.8 dBA

Max = 87.3 dBA

L50 = 57.2 dBA

Min = 45.3 dBA



L10 = 63.9 dBA

L95 = 49.6 dBA

Attività di cantiere: **lavorazioni di finitura del tracciato infilaggio cavi ed altre lavorazioni affini**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni manuali o con attrezzi elettrici manuali**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche**

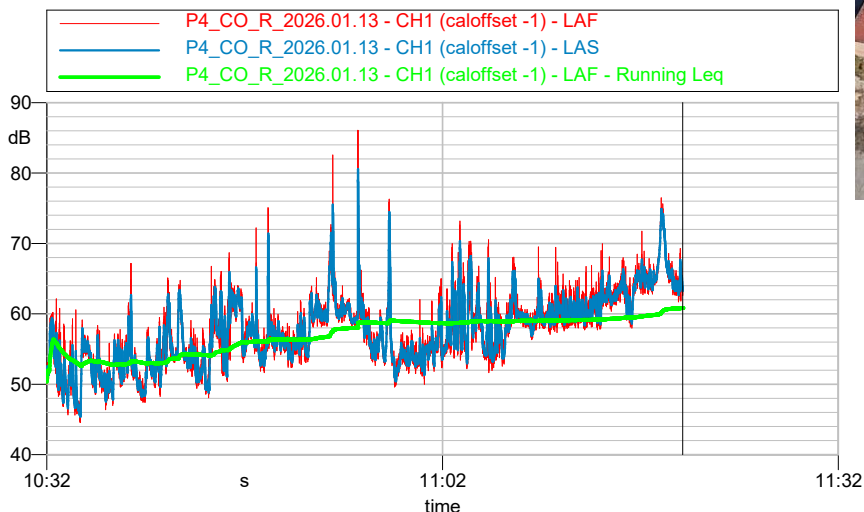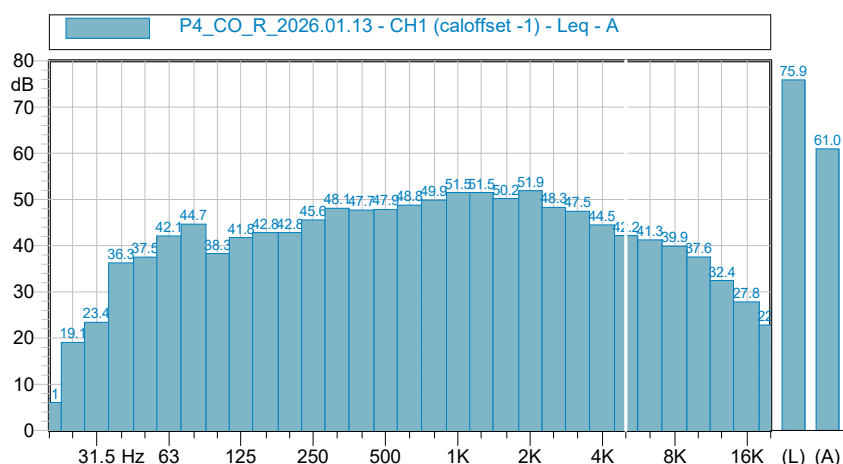

VALORE ANTE OPERA

LAeq
75 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
60.8 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE IV
65 dBA

NOTE
