

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39_CO_R_2026.01.22**

Posizione **Capolinea Dep. Voltabarozzo**

Data mis.: 22/01/2026

Ora inizio: 10:00:11

Ora fine: 10:59:20

Durata: 3549.4 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 7°C

Precipitazioni: /

Umidità: 64%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 58.4 dBA

Max = 79.5 dBA

L50 = 56.2 dBA

Min = 50.5 dBA



L10 = 59.6 dBA

L95 = 53.1 dBA

Attività di cantiere: **costruzione delle strutture del deposito convogli tranviari, strutture portanti e finiture**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni soprattutto con PLE ed attrezzature di sollevamento cose/persone**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e della officina meccanica confinante**

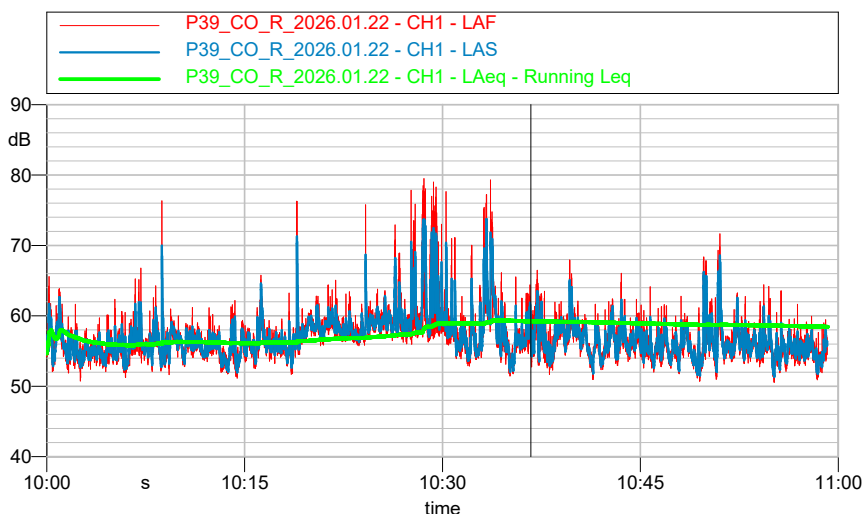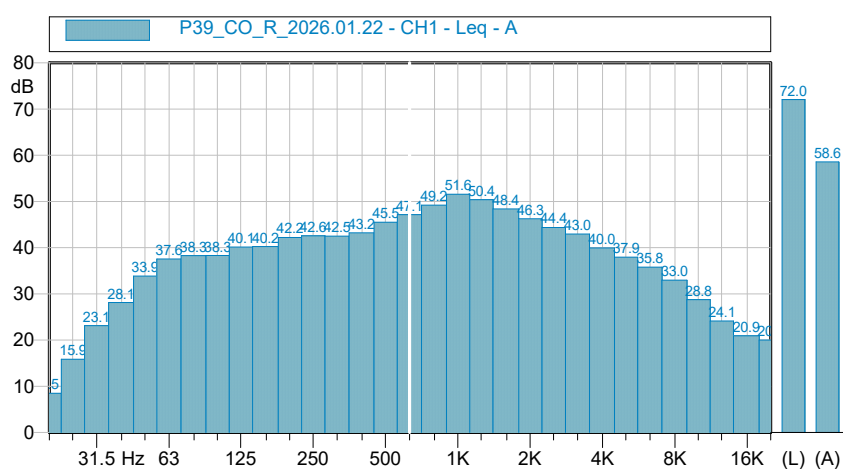

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
58.4 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
