

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P38-CO-R_2026.02.24

Microcantiere: L7 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Fermata PIOVESE - Via Piovese

Data misura: 24/02/2026 Durata: 2515.2 sec Temperatura: 9°C
Ora inizio: 09:44:00 Precipitazioni: / Umidità: 92%
Ora fine: 10:25:55 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



lavorazioni di finitura del tracciato, posa cordoli ed altri elementi di termine

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con attrezzature elettriche ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere:

eventi vibratori dovuti solo al traffico

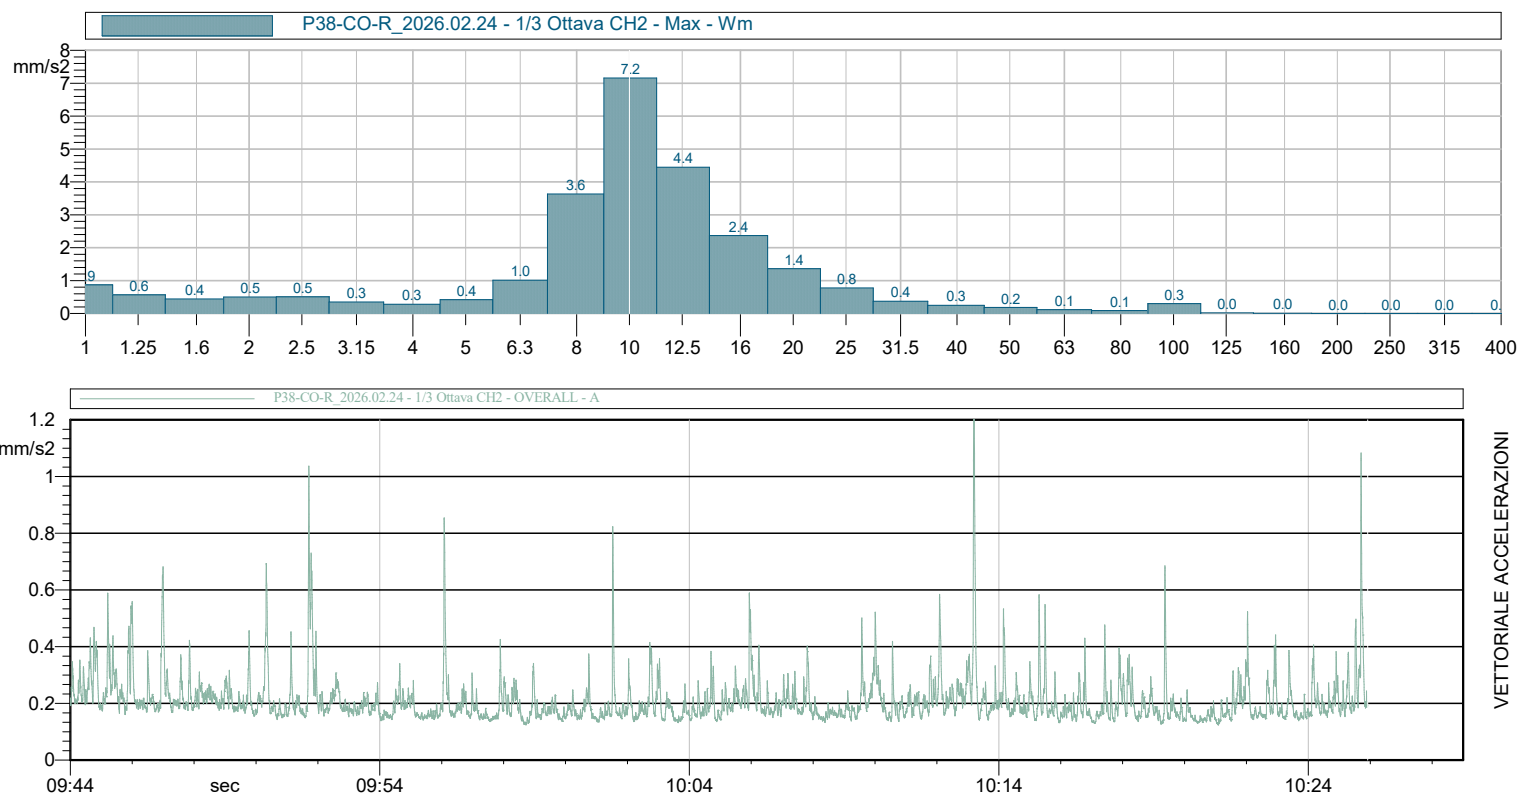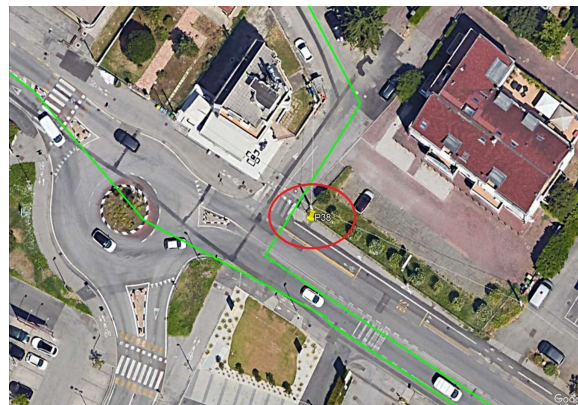

**LIVELLO DI FONDO
(Bianco)**

0.1 mm/s²

**VALORE MISURATO
aw,95**

0.9 mm/s²

**LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo**

7,2 mm/s²

NOTE

**Gli eventi
vibratori dovuti
solo al traffico**
