

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39_CO_R_2026.02.10**

Posizione **Capolinea Dep. Voltabarozzo**

Data mis.: 10/02/2026

Ora inizio: 11:00:10

Ora fine: 11:59:20

Durata: 3550.0 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 9°C

Precipitazioni: /

Umidità: 86%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 58.4 dBA

Max = 78.9 dBA

L50 = 55.4 dBA

Min = 49.3 dBA



L10 = 59.2 dBA

L95 = 52.2 dBA

Attività di cantiere: **costruzione delle strutture del deposito convogli tranviari, strutture portanti e finiture**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni soprattutto con PLE ed attrezzature di sollevamento cose/persone**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e della officina meccanica confinante**

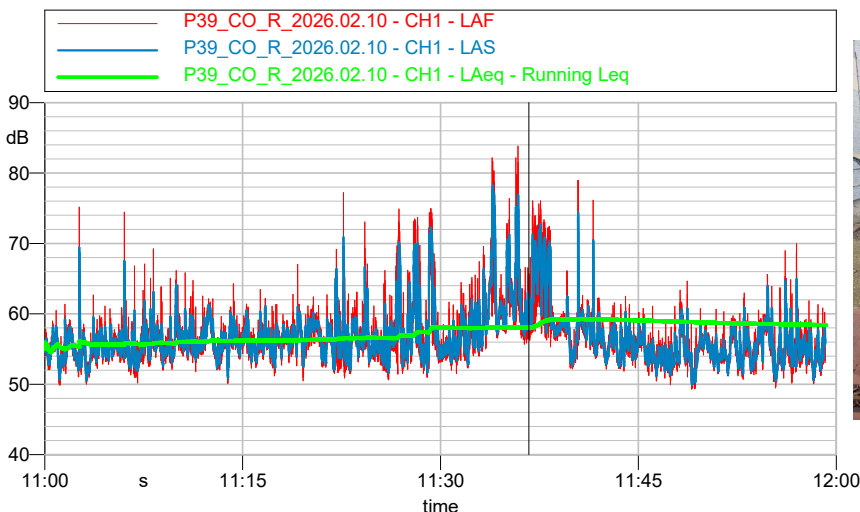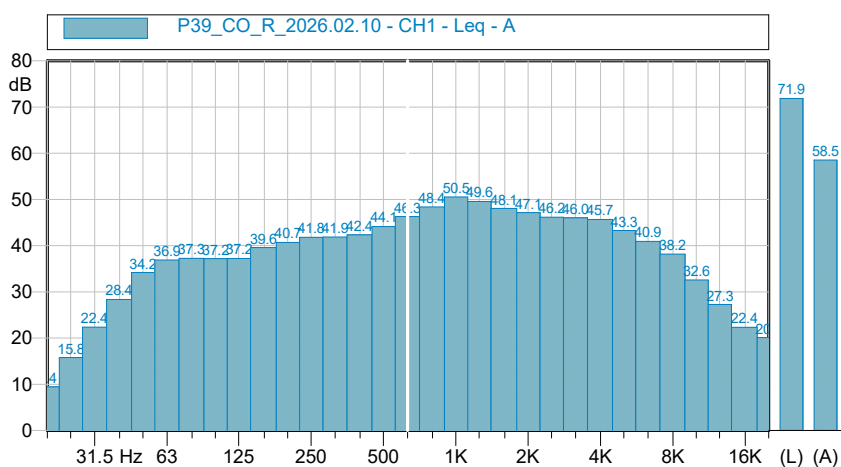

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
58.4 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
