

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P39_CO-R_2026.03.19**

Posizione **Capolinea Dep. Voltabarrozzo**

Data mis.: 19/03/2026

Ora inizio: 14:08:59

Ora fine: 15:42:18

Durata: 5599.1 sec

Microcantiere: **M**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 12°C

Precipitazioni: /

Umidità: 52%

Vento: inf. 5 m/s

Leq = 66.3 dBA

Max = 85.8 dBA

L50 = 53.0 dBA

Min = 47.3 dBA



L10 = 66.7 dBA

L95 = 50.3 dBA

Attività di cantiere: **costruzione delle strutture del deposito convogli tranviari, strutture portanti e finiture**

Eventi generati dal cantiere: **lavorazioni soprattutto con PLE ed attrezzature di sollevamento cose/persone**

Eventi non generati dal cantiere: **rumore di fondo del traffico cittadino e della officina meccanica confinante**

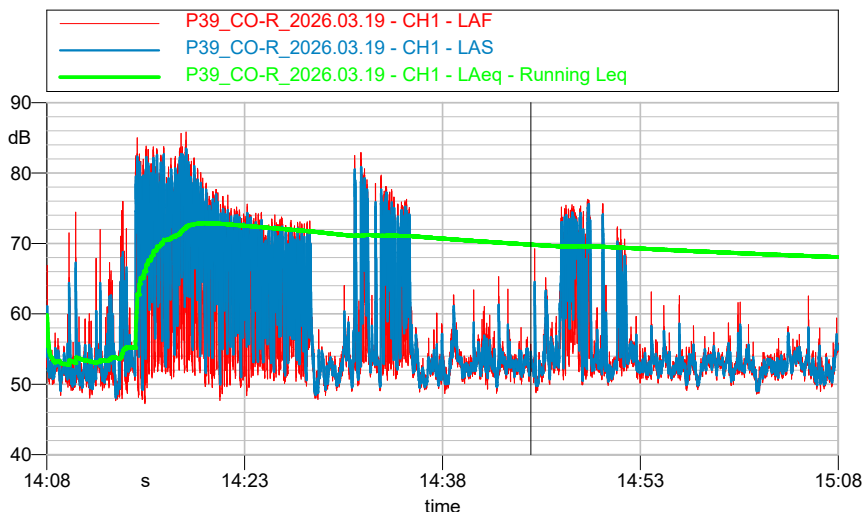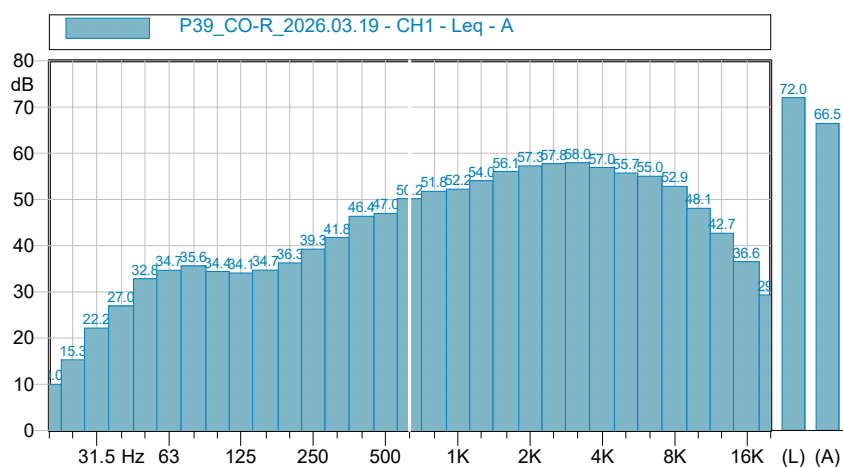

VALORE ANTE OPERA

LAeq
65 dBA

valore estratto da modelli
di studio del clima acustico

VALORE CORSO
D'OPERA MISURATO

LAeq
66.3 dBA

LIMITE DI ZONA

CLASSE III
60 dBA

NOTE
